



Veselības ministrija

Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, tālr. 67876000, fakss 67876002, e-pasts vm@vm.gov.lv, www.vm.gov.lv

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā Nr. 01-11.1/968

Uz 23.02.2017 Nr.622.12/1-68-12/17

Latvijas Republikas Saeimas
kancelejai

Par atbilžu sniegšanu uz Saeimas deputātu
jautājumu pieprasījumu Nr. 270/J12

Atbildot ar Latvijas Republikas Saeimas kancelejas 2017.gada 23.februāra vēstuli Nr. 622.12/1-68-12/17 iesniegto Saeimas deputātu jautājumu Nr.270/J12 “par neatbilstībām saistībā ar Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunā korpusa būvniecības izmaksām”, sniedzu sekojošas atbildes.

- 1. Kā Jūs varat apgalvot, ka steidzamībai nebija ietekmes uz izmaksām, ja Jums nav alternatīvi izpildītāja piedāvājumi garākiem termiņiem, turklāt Iepirkumu komisija izpildītājam ir uzsvērusi termiņu saīsināšanas nepieciešamību?*

Atbilde: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” iepirkuma komisijas skatījumā būvprojekta izstrādei piedāvāto termiņu bija iespējams saīsināt optimizējot projektēšanas darbu organizāciju, taču, ievērojot to, ka nesen iepriekš bija stājušies spēkā jauni būvniecību regulējoši normatīvie akti un principiāli izmainīta būvprojekta izstrādes un saskaņošanas kārtība, sarunu partneris neriskēja piedāvāt saīsinātu termiņu. Termiņu saīsināšana tika aktualizēta būvprojekta izstrādei nevis būvdarbiem. Būvdarbu izpildes termiņu noteica pretendents savā piedāvājumā, tāpēc nav pamata pieņemt, ka ilgāks būvdarbu izpildes termiņš būtu ļāvis pretendētājam piedāvāt zemākas būvdarbu izmaksas, drīzāk gan otrādi, ja vērtē pieskaitāmās izmaksas, tai skaitā maksu par pilsētas infrastruktūras izmantošanu, norobežojumu un nožogojumu nomu.

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

SANEMTS
Latvijas Republikas Saeimā
02.03.2017. plkst. 8:00
Nr. 1/66 - 12/17

2. *Kāpēc Iepirkumu komisija 2016. gada 6.aprīļa sēdē (protokols Nr.7) gala lēmumu par izpildītāja piedāvātās cenas apstiprināšanu ir pieņēmusi citā sastāvā, kas tajā dienā apstiprināts ar jaunu rīkojumu? Kādi bija iemesli Iepirkumu komisijas sastāva maiņai?*

Atbilde: Iepirkuma komisijas sastāvs tika izmainīts, jo 31.03.2016. darbu slimnīcas Jaunās būvniecības daļas vadītāja amatā beidza A. Balodis, kurš vienlaikus bija arī iepirkuma komisijas priekšsēdētājs.

3. *Lūdzam iesniegt PSKUS 2016. gada 6.aprīļa rīkojumu Nr.181 par Iepirkumu komisijas sastāva maiņu (par grozījumiem rīkojumā Nr.396).*

Atbilde: lūdzu skatīt pielikumā 2016. gada 6.aprīļa rīkojumu Nr.181 par Iepirkumu komisijas sastāva maiņu.

4. *Cik liela ir būvniekam SBRE līdz šim piestādīto līgumsodu summa?*

Atbilde: Pilnsabiedrībai SBRE par Iepirkuma līgumā SKUS 40/13 noteikto būvdarbu izpildes termiņa kavējumu ir aprēķināts līgumsods 355 574 euro apmērā.

5. *Ja līgumsodu summa ir mazāka par termiņu kavējuma dēļ projekta papildus administrēšanas izmaksām, kā tiks segtas atlikušās neseģtas papildus izmaksas?*

Atbilde: skaidroju, ja pēc iepirkuma līgumā SKUS 40/13 paredzēto darbu izpildes tiks konstatēti būvdarbu izpildes termiņa kavēšanas dēļ slimnīcai radīti zaudējumi, slimnīca lems par to atlīdzināšanas pieprasīšanu. Zināmā mērā par sodu pilnsabiedrībai SBRE saistībā ar termiņu kavējumu uzskatāmas ēkas uzturēšanas izmaksas kavējuma periodā, kas ietver gan apkures gan elektrības izmaksas, ko šobrīd sedz pilnsabiedrība SBRE.

6. *Ja līgumsodu summa ir lielāka par papildus administrēšanas izmaksām, kā tiek izmantots līgumsodu summas pārpalikums?*

Atbilde: skaidroju, ja ieturētā līgumsoda summa pārsniegs papildus administrēšanas izmaksas, tās atlikusī daļa paliks slimnīcas rīcībā un tiks izlietota A korpusā paredzēto ārstniecības procesu pilnveidošanai.

7. *Kāpēc Pasaules bankas ziņojums ir tik autoritatīvs, ka Jūs uz to akli paļaujaties, nepārbaudot argumentu, pieņēmumu un aprēķinu pamatotību un atbilstību Latvijas reālajai situācijai? Uz ko balstoties iegūti tajā minētie secinājumi par indikatīvajām izmaksām?*

Atbilde: skaidrojam, ka 2014. – 2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem veselības aprūpes nozarē tika izvirzīts būtisks priekšnosacījums – veikt pētījumu par situāciju veselības aprūpes nozarē, analizēt un noteikt prioritātes, uz ko pamatojoties Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa Nr.9.2.3. „Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai” ietvaros tika veikts zinātnisks pētījums, ko veica Pasaules banka. Pasaules banka savu pētījumu izstrādāja pētot faktisko Latvijas situāciju un pieredzi, tostarp salīdzinot ar citu valstu pieredzi, un balstoties uz vispārējiem pieņēmumiem. Attiecībā uz indikatīvo izmaksu noteikšanu Pasaules bankas ziņojumā, lūdzu skatīt atbildē uz 12.jautājumu norādīto hipersaiti. Papildus vēršam uzmanību, ka Veselības ministrija ir izanalizējusi saņemto Pasaules Bankas ziņojumu un tajā minētos aprēķinus un rekomendācijas atbilstoši Latvijas situācijai, līdz ar to nozares un Eiropas Savienības fondu plānošanā tiek izmantoti ziņojumā paustie argumenti, aprēķini un pieņēmumi, kuru pamatotība ir atzīta kā atbilstoša esošajai situācijai.

8. *Vai jūs neuzskatāt, ka šāda rīcība ir vērtējama kā bezatbildīga? Lūdzam to pamatot.*

Atbilde: informēju, ka faktiskās jaunā A korpusa 2.kārtas būvniecības izmaksas tiks noteiktas noslēdzoties iepirkumam atbilstoši Publiskajam iepirkumu likumam. Līdz šim minētie izmaksu plānošanas pieņēmumi, kas izriet gan no A korpusa 1.kārtas būvniecības līguma pieredzes (tostarp ņemot vērā plānoto būvniecības izmaksu pieaugumu), gan no Pasaules bankas pētījumā noteiktajām indikatīvajām izmaksām, gan no Tartu slimnīcas pieredzes, gan no Latvijas slimnīcu jaunbūvju pieredzes, tai skaitā informācija par nesalīdzinošiem būvniecības apjomiem un citiem profiliem, ir izmantota kā plānošanas mehānisms izmaksu noteikšanai. Tostarp visi šie pieņēmumi ir izvērtēti un analizēti arī Veselības ministrijā un pieņēmumi nav pretrunā viens otram un sniegti atbildēs uz konkrētiem jautājumiem.

9. *Kāpēc Veselības ministrija pati nav veikusi izpēti par iespējamām būvniecības izmaksām, ņemot vērā šī konkrētā projekta nozīmīgumu?*

Atbilde: lūdzu skatīt atbildi uz 7.jautājumu, kā arī, kā jau informēju savā atbildē uz deputātu jautājumu Nr.262/J12, slimnīca 2016.gadā pasūtīja Latvijas Būvinženieru savienības eksperta atzinumu par A korpusa otrās kārtas projektēšanu un būvdarbiem VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, kur salīdzināšanai piedāvāto objektu kv.m. izmaksas svārstās no 1 286 EUR līdz 4 619 EUR ar PVN. Vēršu uzmanību, ka šis bija neatkarīga eksperta atzinums, līdz ar to nebija pamata iepirkt šādu pakalpojumu atkārtoti.

10. *Pie kādas projekta summas Veselības ministrija uzskatītu par pamatotu un nepieciešamu veikt izpēti par iespējamajām būvniecības izmaksām, lai varētu gūt pārliecību, ka projektā paredzētās izmaksas ir pamatotas?*

Atbilde: lūdzu skatīt atbildi uz 9.jautājumu un vienlaikus vēršu uzmanību, ņemot vērā, ka VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” pasūtīja neatkarīga eksperta viedokli Veselības ministrija kā VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” kapitāldaļu turētājam nav saimnieciski pamatoti atkārtot šādu ekspertīzi un nav pamata apšaubīt veiktās ekspertīzes slēdziena patiesumu. Tostarp Veselības ministrija rīkojas atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam, nodrošina kapitālsabiedrības uzraudzību, savukārt kapitālsabiedrība informē ministriju par valdes pieņemtajiem nozīmīgajiem lēmumiem.

11. *Kāpēc vienā gadījumā (atbilde uz deputātu jautājuma Nr.262/J12 9.punktu) Jūs norādāt, ka salīdzinājums ar citu Latvijas slimnīcu būvniecības izmaksām nav adekvāts, bet, atbildot uz šo jautājumu, Jūs tomēr to izmantojat kā argumentu?*

Atbilde: lūdzu skatīt atbildi uz 8.jautājumu.

12. Lūdzam iesniegt Pasaules bankas ziņojuma daļu, kurā ir minētas Jūsu nosauktās indikatīvās izmaksas.

Atbilde: ņemot vērā Pasaules bankas pētījuma ziņojuma “Latvijas veselības aprūpes infrastruktūras ģenerālplāns 2016-2025” lielo apjomu, lūdzam lietot hipersaiti: <http://vmnvd.gov.lv/lv/esf-projekts/zinojumi> un skatīt ziņojuma 10. sadaļu “Investīciju plānošana: Akūtā stacionārā infrastruktūra un aprīkojuma izmaksas” (no 146. līdz 163.lpp.).

13. Lūdzam iesniegt Veselības ministrijas vērtējumu Pasaules bankas ziņojumā sniegtajai analīzei un argumentācijai par slimnīcas būvniecības indikatīvajām izmaksām.

Atbilde: informēju, ka atsevišķu vērtējumu par Pasaules bankas pētījumiem Veselības ministrija nav plānojusi veikt, bet izanalizējot saņemtajā pētījumā ietvertos aprēķinus un rekomendācijas un balstoties uz Pasaules Bankas pētījuma politikas rekomendācijām un ņemot vērā to atbilstību esošajai situācijai, Veselības ministrija izstrādāja informatīvo ziņojumu „Rīcības plāns Pasaules Bankas pētījuma rezultātu izmantošanai nacionālajos politikas plānošanas dokumentos un ES fondu ieviešanas nosacījumos” (MK 27.09.2016. sēdes protokols Nr.48, 59.§, TA-1968), kas paredz, ka ES fondu ieviešanas nosacījumi investīcijām augstas intensitātes stacionārajās ārstniecības iestādēs tiek izstrādāti un apstiprināti, kā arī projektu iesniegumi tiek atlasīti paralēli veselības nozares nacionālā politikas plānošanas dokumenta izstrādei un apstiprināšanai, tai skaitā, balstoties arī uz valdības lēmumu par augstas intensitātes veselības aprūpes

iestāžu kartējumu un attīstību. Tādejādi 2016.gada 20.decembrī Ministru kabinetā tika apstiprināts Informatīvais ziņojums “*Par sistēmiski svarīgo ārstniecības iestāžu kartējumu un attīstības reformu*” (MK 20.12.2016. sēdes protokols Nr.69, 83.§, TA-2791), kuru Veselības ministrija izstrādājusi pamatojoties uz Pasaules Bankas pētījuma par Latvijas veselības sistēmu ziņojumiem, tai skaitā ziņojumu „Latvijas veselības aprūpes infrastruktūras ģenerālplāns 2016-2025”, ziņojumu „Slimnīcu apjomi un aprūpes kvalitāte Latvijā” un ziņojumu „Kvalitatīvs pētījums par Latvijas veselības aprūpes sistēmas trūkumiem”, kā arī ņemot vērā citus Pasaules Bankas pētījuma ziņojumus. Kā arī Veselības ministrija šobrīd strādā pie veselības nozares nacionālā politikas plānošanas dokumenta sagatavošanas.

14. Ja Jūsu rīcībā nav pamatojumu pieņēmumiem A2 korpusa būvniecības finansējuma aprēķināšanai, kāpēc šie pieņēmumi vispār ir noteikti? Kāda ir to jēga? Jo vairāk tādēļ, ka to pārkāpšana, Jūsaprāt, ir nenozīmīga “tehniska neprecizitāte” (skat.Jūsu atbildi uz deputātu jautājuma Nr.262/J12 10.punkta jautājumu)?

Atbilde: papildus sniegtajai atbildei uz 8.jautājumu skaidroju, ka visi izmaksu pieņēmumi tikuši aprēķināti un analizēti. Papildus minēto avotu pieņēmumiem par izmaksu pamatotību būvniecības projektu praksē tiek izmantoti vispārēji pieņēmumi projektēšanas, tehniskās ekspertīzes, autoruzraudzības, būvuzraudzības izmaksu plānošanai un noteikšanai, ko aprēķina kā noteiktu procentu no būvdarbiem. Izmaksu plānošanas pamatojumu mērķis ir noteikt kopējās izmaksas, plānojot projektam nepieciešamo finansējumu un plānojot iepirkumus. Sniedzot atbildes uz deputātu iepriekšējiem jautājumiem, ieviesās tehniska neprecizitāte, kas skaidrojama ar cilvēcisko faktoru un kas, ņemot vērā pieaugošo informācijas pieprasījumu apjomu īsos izpildes termiņos, ir saprotama, un, kā jau sniedzu informāciju iepriekšējā vēstulē, tā neietekmē finansējuma apjoma kopējās izmaiņas, kā arī precīza summa tiks noteikta pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

15. Ņemot vērā, ka A2 korpusa būvniecības projekta summa ir vairāki desmiti miljoni euro, kā Jūs vērtējat šādu aritmētisku neatbilstību pieļaušanu? Vai tā ir apzināta manipulēšana ar nepatiesiem skaitļiem vai nespēja veikt elementāras aritmētikas darbības?

Atbilde: lūdzu skatīt atbildi uz 14.jautājumu.

16. Kad un kādas darbības Veselības ministrija veiks, lai novērstu šīs neatbilstības projekta finanšu plānošanā?

Atbilde: vēršu uzmanību, ka līdz šim minētie izmaksu pieņēmumi ir plānošanas instruments. Šobrīd nav konstatētas neatbilstības projekta finanšu plānošanā. Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma Nr.39 45.§. „*Informatīvais ziņojums “Par VSIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes*

slimnīca” A korpusa otrās kārtas attīstību” un atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai un Publisko izdevumu revīzijas komisijai (par P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecību)” (turpmāk – 09.08.2016 MK protlem.Nr.39 45.§.) 8.punktā noteiktajam ir uzdots Veselības ministrijai un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai vienoties par projekta īstenošanas un uzraudzības kapacitātes stiprināšanas pasākumiem, atsaucoties uz ko 2016.gada 22.novembrī starp VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Veselības ministriju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgta starpresoru vienošanās par sadarbību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ieviešanā, tostarp, ka nodrošina pagaidu projekta ik mēneša uzraudzību, ik ceturkšņa ziņojumu izskatīšanu, kas tostarp nodrošinās arī neatbilstību novēršanu finanšu plānošanā.

17. Kāpēc A2 korpusa būvniecības plānotās izmaksas vairākkārtīgi esat pamatojusi ar Tartu universitātes slimnīcas izmaksām, ja nevarat sniegt korektu salīdzinājumu?

Atbilde: informēju, ka salīdzinājums ar Tartu universitātes slimnīcu tika minēts, jo tika prasīts sniegt objektīvu salīdzinājumu un tas ir jaunākais līdzīga apjoma infrastruktūras objekts tuvākajos kaimiņos. Attiecībā par korektu salīdzinājumu, sniedzu salīdzinājumu par kategorijām, par kurām ir pieejama informācija un kas ir vispārpieņemtas būvniecības izmaksu plānošanas praksē.

18. Vai šāds korekts salīdzinājums ir Jūsu rīcībā, vai arī Jūs operējat tikai ar Jūsu nosauktajiem virspusējiem datiem un saviem voluntāriem pieņēmumiem?

Atbilde: lūdzu skatīt atbildi uz 17.jautājumu. Papildus vēršu uzmanību, ka slimnīcas A korpusu 2.kārtas plānoto izmaksu noteikšanai tika ņemti vērā vairāki pieņēmumi (skatīt atbildi uz 8.jautājumu), kuri ir pietiekami un, manuprāt, arī korekti, lai plānošanas procesā identificētu nepieciešamo finansējumu, tostarp neatkarīga eksperta izvērtējums.

19. Kāds bija iemels, kāpēc A1 korpusa būvniecības iepirkums notika slēgtā konkursā tikai ar vienu pretendentu?

Atbilde: A korpusa pirmās kārtas tehniskā projekta izstrādei, autoruzraudzībai un būvdarbiem tika veikts iepirkums piemērojot iepirkuma procedūru “Slēgts konkurss”. Izvēlētā iepirkuma procedūra ļāva uzsākt iepirkumu pirms skiču projekta un tehnisko specifikāciju izstrādes pilnīgas pabeigšanas, tādejādi paātrinot tehniskā projekta izstrādes un būvdarbu izpildes līguma noslēgšanu, jo pretendentu kvalifikācijas pārbaude un atlase dalībai konkursa otrajā kārtā tika

veikta vienlaikus ar iepirkuma tehnisko specifikāciju sagatavošanu. Konkursa pirmajā kārtā saskaņā ar kandidātu atlases nolikuma noteikumiem piedāvājumu iesniedza tikai viens pretendents (SIA "RE&Re" un SIA "Skonto Būve" apvienība), kurš tika atzīts par atbilstošu nolikuma prasībām.

20. *Vai Veselības ministrijai ir aprēķini, kā pretendentu konkurences trūkums iepirkumā sadārdzināja būvniecības izmaksas un ietekmēja termiņu kavējumus?*

Atbilde: informēju, ka piedāvājumu pretendentu atlasei slēgtā konkursa pirmajā kārtā atbilstoši PIL regulējumam varēja iesniegt jebkurš pretendents, kurš atbilst kandidātu atlases nolikuma prasībām, tādējādi nodrošinot iepirkuma procesa atklātumu un vienlīdzīgu tirgus dalībnieku konkurenci, kas atspoguļoja tā brīža būvniecības izmaksas, savukārt atsevišķi aprēķini par iespējamu būvniecības sadārdzinājumu netika veikti. Izvēlētās iepirkuma procedūras veids nevarēja ietekmēt līguma darbu izpildes termiņu kavējumus, jo piedāvājums tika sagatavots, ievērojot konkursa nolikumā noteikto darbu izpildes termiņu. Slēgta konkursa procedūras izmantošana iepirkuma veikšanai ļāva saīsināt laiku, kas bija nepieciešams iepirkuma sagatavošanai un veikšanai, tādējādi paātrinot līguma noslēgšanu un darbu izpildes uzsākšanu.

21. *Lūdzam pamatot Jūsu atbildi, un paskaidrot – cik liela apmēra izmaksu neatbilstības var tikt uzskatītas par "tehnisku neprecizitāti" un var netikt ņemtas vērā?*

Atbilde: lūdzu skatīt atbildi uz 14., 15. un 16.jautājumiem.

22. *Cik lielā apmērā drīkst neievērot Jūsu pieņemto A2 korpusa būvniecības izmaksu kritērijus?*

Atbilde: skaidroju, ka minētās plānotās slimnīcas A korpusa 2.kārtas attīstības izmaksas ir noteiktas informatīvajā ziņojumā (09.08.2016 MK protlem.Nr.39 45.§.). Slimnīcas A korpusa 2.kārtas attīstības projekts īstenojams atbilstoši 27.12.2016 Ministru kabineta noteikumos Nr.870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu" noteiktajam, tostarp atbilstoši noteiktajām atbalstāmajām darbībām un to ierobežojuma nosacījumiem, kā arī pieejamajam attiecināmajam finansējumam. Šobrīd tiek gatavota projektu iesniegumu atlases dokumentācija, tiks izsludināta atlase, pēc kuras projekta iesniedzējs - slimnīca gatavos lielā projekta iesniegumu. Lielā projekta iesniegums tiks vērtēts gan nacionālā līmenī atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem no Veselības ministrijas, Finanšu ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras puses, gan no Eiropas komisijas nozīmētu ekspertu puses, gan no pašas Eiropas komisijas puses. Pēc lielā projekta

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

apstiprināšanas tiks slēgts līgums par projekta īstenošanu. Projekta darbības projekta ietvaros tiek īstenotas iepirkumus regulējošos normatīvo aktu ietvaros.

23. Vai arī turpmāk Jūsu attieksme būs tik pat pielaidīga arī pret citiem pārkāptiem kritērijiem? Lūdzam to pamatot.

Atbilde: lūdzu skatīt atbildi uz 22.jautājumu un vienlaikus vēršu uzmanību, ka nav pārkāpti finansējuma plānošanas pieņēmumu kritēriji.

Pielikumā: VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 2016. gada 6.aprīļa rīkojumu Nr.181 par Iepirkumu komisijas sastāva maiņu uz 1.lpp.

Veselības ministre

(paraksts*)

Anda Čakša

Laika zīmogs:
01.03.2017.

A.Tomsone, 67876181
Agnese.Tomsone@vm.gov.lv



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

«PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA»

Vienotais reģ. Nr. 40003457109 • Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 • tālrunis: 67069601, 67069600

fakss: 67069661 • e-pasts: stradini@stradini.lv • www.stradini.lv

RĪKOJUMS

Rīgā

06.04.2016.

Nr. 181

Par grozījumiem 30.12.2015. rīkojumā Nr. 396

“Par iepirkuma komisijas izveidi

iepirkumam „VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

A korpusa jaunbūves lietus ūdens novadīšanas tīkla

papildus būvdarbu veikšana Liepājas ielas posmā

starp Atpūtas ielu un K.Ulmaņa gatvi,

18.02.2013. noslēgtā iepirkuma līguma Nr. SKUS 40/13 ietvaros”

(ID Nr. PSKUS 2015/40)

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 22.pantu, **valde uzdod:**

veikt grozījumus 30.12.2015. rīkojumā Nr.396 ““Par iepirkuma komisijas izveidi iepirkumam „VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa jaunbūves lietus ūdens novadīšanas tīkla papildus būvdarbu veikšana Liepājas ielas posmā starp Atpūtas ielu un K.Ulmaņa gatvi, 18.02.2013. noslēgtā iepirkuma līguma Nr. SKUS 40/13 ietvaros” (ID Nr. PSKUS 2015/40) ” un izteikt rīkojuma 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1.Izveidot iepirkuma komisiju iepirkuma “VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa jaunbūves lietus ūdens novadīšanas tīkla papildus būvdarbu veikšana Liepājas ielas posmā starp Atpūtas ielu un K.Ulmaņa gatvi, 18.02.2013. noslēgtā iepirkuma līguma Nr. SKUS 40/13 ietvaros” (turpmāk –iepirkums) veikšanai šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: **Gundars Vārna**
Jaunās būvniecības daļas projekta vadītājs

Komisijas locekļi: **Eva Sokolova**
Iepirkumu daļas vadītāja;

Ira Koleba
Iepirkumu daļas vecākā iepirkumu speciāliste;

Vineta Apine
Iepirkumu daļas vecākā iepirkumu speciāliste;

Lāsma Vītoliņa
Iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste.

2.Plānotās līgumsaistības noteiktas 1 267 885,10 EUR bez PVN apmērā. Ja iepirkuma realizācijas gaitā tiek konstatēts, ka piedāvātā līgumcena pārsniedz plānotās līgumsaistības, iepirkuma komisijai minētais jautājums jāsniedz izskatīšanai valdei.”

Valdes locekle

E.Buša

Valdes loceklis

N.Štāls

E.Sokolova 67069736



Veselības ministrija

Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, tālr. 67876000, fakss 67876002, e-pasts vm@vm.gov.lv, www.vm.gov.lv

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā Nr. 01-11.1/965

Uz 23.02.2017 Nr.622.12/1-68-12/17

Latvijas Republikas Saeimas kancelejai

*Par atbilžu sniegšanu uz Saeimas deputātu
jautājumiem Nr.271/J12 un Nr.272/J12*

Atbildot uz Latvijas Republikas Saeimas kancelejas 2017. gada 23. februāra vēstulē Nr. Nr.622.12/1-68-12/17 uzdoto Saeimas deputātu jautājumu Nr. Nr.271/J12, Veselības ministrija atbilstoši kompetencei sniedz informāciju:

1. Vai Nacionālais Veselības dienests (turpmāk - NVD) un citas Veselības ministrijas padotības iestādes, apkopojot statistiskos rādītājus par ģimenes ārstu darbu, iekļauj tajos bloķētos pacientus?

NVD katrā atsevišķā gadījumā vērtē attiecīgās statistikas mērķi un to, vai nepieciešams ņemt vērā informāciju par bloķētiem pacientiem. Atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1529) 14.pielikuma “Ģimenes ārsta gada darbības novērtēšanas un maksājuma sadales metodika” 4.5.apakšpunktam, vērtējot ģimenes ārstu gada darbības kvalitātes rādītājus, informācija par personām ar bloķētu reģistrāciju netiek ņemta vērā.

2. Cik daudz pacientu kopš šī procesa uzsākšanas ir bloķējis NVD?

Pienākums bloķēt pacientu reģistrāciju pie ģimenes ārsta ir iekļauts ne tikai MK noteikumos Nr.1529, bet bija iekļauts arī Ministru kabineta 2006.gada 19. decembra noteikumos Nr. 1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" un Ministru kabineta 2004. gada 21. decembra noteikumos Nr.1036 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”. Līdz ar to

SAŅEMTS
Latvijas Republikas Saeimā

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

02.03.2017. plkst. 9:00

Nr. 1/67 - 12/17

pacientu reģistrācijas bloķēšana tiek veikta visu laiku. Uz 2016. gada 31. decembri ir bloķēta aptuveni 100 000 personu reģistrācija pie ģimenes ārsta.

3. Cik daudz EVAK kartes vai S veidlapas par bloķēto pacientu aprūpi ir saņēmis NVD?

Valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti visām personām, kas atbilst Ārstniecības likuma 17.panta pirmās daļas 1.punktam, un tās ir:

- 1) Latvijas pilsoņi,
- 2) Latvijas nepilsoņi,
- 3) personas ar pastāvīgām uzturēšanās atļaujām;
- 4) Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas (turpmāk – ES) dalībvalstu pilsoņi, kas nodarbināti Latvijas Republikā un viņu ģimenes locekļi.
- 5) bēgļi un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss;
- 6) aizturētās, apcietinātās un ar brīvības atņemšanu notiesātās personas.

Līdz ar to atbilstoši minētajam normatīvajam regulējumam arī personām, kuras ir izceļojušas no Latvijas un dzīvo vai strādā citā ES dalībvalstī, bet ir Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, ir tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā.

Ņemot vērā, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem personām, kuru reģistrācija pie ģimenes ārsta ir bloķēta, ir tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus tādā pašā apmērā kā personām, kuru reģistrācija nav bloķēta, pie pakalpojumu saņemšanas nav nepieciešams uzrādīt EVAK un S veidlapas, ja tādas personai ir izsniegusi cita ES dalībvalsts.

4. Cik lielus līdzekļus no citām Eiropas Savienības valstīm NVD ir atguvis par bloķētajiem pacientiem?

NVD, veicot līdzekļu atgūšanu no citām valstīm, neveic uzskaiti par personu statusiem pakalpojumu saņēmēju reģistrā.

Kopējie NVD atgūtie līdzekļi ir šādi:

| Gads | Dienesta atgūtās summas apmērs (EUR) |
|------------|--------------------------------------|
| 2016.gads* | 124 934,54 |
| 2015.gads | 215 077.75 |
| 2014.gads | 170 411.15 |
| 2013.gads | 201 161.33 |
| 2012.gads | 62 170.78 |
| 2011.gads | 78 897.70 |
| 2010.gads | 147 090.75 |

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

| | |
|-----------|-----------|
| 2009.gads | 48 025.54 |
| 2008.gads | 65 524.58 |
| 2007.gads | 8 982.89 |
| 2006.gads | 6 742.25 |

* Par 2016.gadu pilnībā nav apkopota informācija par atgūtajiem līdzekļiem. Ailē norādīta summa, par kādu citām valstīm ir izsniegti rēķini.

5. Vai tīri statistiski NVD, apkopojot datus, kurus iespējams var iegūt no VID un VSAA datu bāzēm, ir apzinājis reāli Latvijā nedzīvojošos un nestrādājošos pacientus darbaspējīga vecumā, kuri vēl nav iekļauti bloķēto pacientu sarakstā?

Valsts ieņēmumu dienestam (VID) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) nav tiesiska pamata izsniegt NVD informāciju par personu nodarbinātību, ja tā nav nepieciešama NVD funkciju izpildei. Atbilstoši normatīvajiem aktiem šobrīd, lai piešķirtu personai tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, nodarbinātības faktu nepieciešams konstatēt tikai par ES dalībvalstu pilsoņiem. Savukārt, personas reģistrācijas pie ģimenes ārsta bloķēšana tiek veikta MK noteikumos Nr.1529 noteiktajos gadījumos un tajos nav paredzēts vērtēt personas nodarbinātību.

6. Cik lielus naudas līdzekļus, pēc aptuveniem aprēķiniem, NVD nesaņem no citām Eiropas Savienības valstīm par bloķēto pacientu aprūpi?

Veselības ministrijas un NVD rīcībā nav šādas informācijas.

7. Ņemot vērā iepriekš uzdoto jautājumu informāciju, lūdzam Veselības ministriju un NVD izvērtēt, vai nebūtu jāgroza normatīvie akti, lai ļautu izslēgt no ģimenes ārstu pacientu saraksta bloķētos pacientus, kuri uzturas ārpus Latvijas Republikas ilgāk par sešiem mēnešiem vai kuri vērsušies dienestā ar iesniegumu par reģistrācijas bloķēšanu, norādot, ka izceļo no Latvijas Republikas, vai par kuriem NVD no Iedzīvotāju reģistra saņēmis ziņas par izceļošanu no Latvijas Republikas?

Valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti visām Ārstniecības likuma 17.panta pirmajā daļā norādītajām personām. Izmaiņu veikšana attiecīgajā normatīvajā regulējumā ir ne tikai nopietns politisks lēmums, bet arī skatāms kontekstā ar jautājumu par izceļojošo Latvijas iedzīvotāju reemigrāciju.

8. Lūdzam sniegt savu vērtējumu, kā, Jūsaprāt, tiek pildīta Ministru kabineta noteikumu Nr. 1529 45.3 punktā minētā prasība bloķēt attiecīgo personu reģistrāciju pie ģimenes ārsta?

NVD veic personu reģistrācijas pie ģimenes ārsta bloķēšana atbilstoši MK noteikumiem Nr.1529 šādā kārtībā:

- par ieslodzījumu vietā ievietotām personām vai psihiatriskās slimnīcas pacientiem NVD informāciju saņem no Ieslodzījumu vietu pārvaldes vai ārstniecības iestādēm un reizi mēnesī atbilstoši saņemtajai informācija bloķē vai atbloķē personu reģistrāciju pie ģimenes ārsta;
- par personām, kuras ilgstoši uzturas ārpus Latvijas, NVD informāciju saņem no Iedzīvotāju reģistra tiešsaistes režīmā un personas reģistrācijas bloķēšana pie ģimenes ārsta tiek veikta tajā pašā dienā, kad attiecīgs ieraksts tiek iekļauts Iedzīvotāju reģistrā. Reģistrācijas atbloķēšana tiek veikta dienā, kad persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu Latvijā.

Līdz ar to šobrīd uzskatāms, ka NVD pacientu bloķēšanu un atbloķēšanu veic korekti saskaņā ar NVD pieejamo informāciju.

9. Cik lielus zaudējumus veselības budžetā rada šo noteikumu prasību nepildīšana?

Ņemot vērā to, ka prasība par pacientu bloķēšanu tiek pildīta, Veselības ministrija nevar sniegt aprēķinus par zaudējumiem prasības nepildīšanas rezultātā.

10. Sniedziet Jūsu aplēses, par cik mazinātos rindas uz valsts apmaksājamiem izmeklējumiem, ja šīs augstāk minētās prasības tiktu īstenotas?

Ņemot vērā to, ka bloķētie pacienti var saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, turklāt bloķētas tiek ne tikai personas, kuras uzturas ārpus Latvijas Republikas ilgāk par sešiem mēnešiem vai kuras vērsušās NVD ar iesniegumu par reģistrācijas bloķēšanu, norādot, ka izceļo no Latvijas Republikas, vai par kurām NVD no Iedzīvotāju reģistra saņēmis ziņas par izceļošanu no Latvijas Republikas, bet arī psihiatriskā profila stacionāro ārstniecības iestāžu pacienti, kuri nepārtraukti ārstējas ilgāk par trijiem mēnešiem, un ieslodzījumā esošas personas, rindas garuma izmaiņas nav prognozējamas.

11. Kurš ir atbildīgs par šo noteikumu prasību ievērošanas kontroli? Cik un kā tā ir tikusi veikta?

Veselības ministrijas padotības iestādes veic uzdevumus atbilstoši noteiktām funkcijām un uzdevumiem, un to darbu pārrauga gan attiecīgās iestādes vadītājs, gan Veselības ministrija.

Tāpat, atbildot uz Latvijas Republikas Saeimas kancelejas 2017. gada 23. februāra vēstulē Nr. Nr.622.12/1-68-12/17 uzdoto Saeimas deputātu

jautājumu Nr. Nr.272/J12, Veselības ministrija atbilstoši kompetencei sniedz informāciju:

1. Valsts kontrole revīzijā izlases veidā vērtēja 39 politikas plānošanas dokumentos noteiktos pasākumus un secināja, ka 31 no tiem nav ieviests. Neskatoties uz to Veselības ministrijas darbinieki par 2016. gada darbības rezultātiem ir saņēmuši prēmijas 1,4 miljonu euro apmērā.

Lūdzam Jūs paskaidrot – balstoties uz ko, un par ko tieši ir izmaksātas šīs prēmijas situācijā, kad lielākā daļa pienākumos paredzēto uzdevumu nav izpildīti?

Veselības ministrijā 2016.gadā darbinieku prēmijām un naudas balvām izlietots finansējums 122 tūkst. euro apmērā. Novērtēšanas prēmijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir izmaksātas saskaņā ar darbinieku ikgadējās novērtēšanas rezultātiem, kas sasniegti iepriekšējā gada laikā un nav saistīti tikai ar politikas plānošanas dokumentos noteikto pasākumu izpildi. Līdz ar to politikas plānošanas dokumentos iekļauto pasākumi nesastāda lielāko daļu no darbinieku pienākumiem. Turklāt ievērojama daļa no noteiktajiem pasākumiem netika izpildīti, jo to realizācijai netika piešķirts papildus nepieciešamais finansējums, nevis darbinieku neizpildītu pienākumu rezultātā.

Veselības ministrija nepiekrita metodoloģijai, kādā Valsts kontrole vērtēja politikas plānošanas dokumentos noteikto pasākumu izpildi, piemēram, Valsts kontrole novērtēja pasākumu par neīstenotu (neieviestu) arī gadījumos, kad plānotais pasākums tika īstenots pirms pasākuma īstenošanai plānotā laika perioda un politikas plānošanas dokumenta stāšanās spēkā, taču to īstenoja īsi pirms tam, balstoties uz plānošanas dokumenta izstrādē veikto situācijas analīzi.

2. Līdz 01.03.2015. jāievieš pasākums, kas veicinātu optimālu reģistrēto pacientu skaitu ģimenes ārsta praksē, izveidojot mehānismu, kas ierobežo lielo ģimenes ārsta prakšu veidošanos. Taču revīzijā konstatēts, ka Veselības ministrija arvien nav noteikusi optimālo reģistrēto pacientu skaitu ģimenes ārsta praksē.

Lūdzam Jūs paskaidrot, kādēļ joprojām Veselības ministrija nav spējusi noteikt optimālo reģistrēto pacientu skaitu ģimenes ārsta praksē? Ja esiet spējīgi to noteikt – lūdzu definējiet un pamatojiet to! Un norādiet, kurā normatīvajā dokumentā tas ir noteikts.

Saskaņā ar Veselības ministrijai pieejamo informāciju, šobrīd reģistrēto pacientu skaits uz ģimenes ārsta praksi vidēji valstī ir aptuveni 1579 reģistrētie pacienti, kas saskaņā ar starptautiskiem pētījumiem vērtējams kā optimāls (piemēram, saskaņā ar autores Dionne Sofīa Kringos publikāciju “The strength of primary care in Europe” kā viens no stipras primārās veselības aprūpes rādītājiem ir prakses lielums ar pacientu skaitu no 1542 līdz 1774 pacientiem), turklāt

lielākajai daļai ģimenes ārstu reģistrēto pacientu skaits ir no 1600 līdz 1800 reģistrētiem pacientiem.

Vienlaikus jāņem vērā plānošanas dokumentā izvirzītais pasākuma mērķis, kas ir uzlabot ģimenes ārstu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Lai sasniegtu šo mērķi, iespējamo esošo finanšu ietvaros ir veikti citi pasākumi, piemēram, MK noteikumos Nr.1529 ir noteikts pieņemšanas laiks, kā arī māsas/ārsta palīga atbalsts un prasības telpām lielākās ģimenes ārstu praksēs, tādejādi pakalpojumu pieejamības veicināšanai nosakot noteiktus nosacījumus, kas jāizpilda praksēm ar lielāku pacientu skaitu.

3. Cik daudz jauno speciālistu un kādās jomās katru gadu saņem ārsta sertifikātu? Cik no viņiem pamet Latvijas darba tirgu pirmajā gadā pēc rezidentūras pabeigšanas?

Informējam, ka no valsts budžeta līdzekļiem finansēto rezidentūru (Rīgas Stradiņa universitātē un Latvijas Universitātē) 2016.gadā absolvēja 173 rezidenti. Pēc Veselības ministrijas rīcībā esošās informācijas 2016.gadā pirmreizēji tika piešķirti 150 ārsta profesijas specialitātes sertifikāti. Vienlaikus jāatzīmē, ka šajā skaitā ir ārstniecības personas, kuras specialitāti ir ieguvušas iepriekšējos gados.

Attiecībā par rezidentu skaitu, kas pirmajā gadā pēc rezidentūras pabeigšanas pamet Latvijas darba tirgu, informējam, ka profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs ārstniecības personai ir jāsaņem kvalifikācijas atzīšanas institūcijas (ārstu gadījumā tā ir Latvijas Ārstu biedrība) izsniegts dokuments par personas profesionālo statusu un reputāciju Latvijas Republikā.

2016.gadā Latvijas Ārstu biedrība ārstniecības personu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs ir sagatavojusi 172 dokumentus. Būtiski atzīmēt, ka šis skaitlis norāda kopējo sagatavoto dokumentu skaitu, neatkarīgi no ārsta kvalifikācijas iegūšanas gada un šajā skaitā ir ārvalstu studenti, kuri ārsta kvalifikāciju ir ieguvuši Latvijā (dažkārt ir situācijas, ka viena personu lūgusi atkārtoti sagatavot šo dokumentu).

4. Kādi ir iemesli, kādēļ speciālisti netiek piesaistīti Latvijas darba tirgum?

Konkurētspējīgs atalgojums ārstniecības personām ir viens no būtiskākajiem aspektiem, kas ietekmē veselības nozares cilvēkresursu nodrošinājumu veselības aprūpes sistēmā. Darba samaksa ir viens no instrumentiem, ar kuru palīdzību ir iespējams ietekmēt personāla nodrošinājumu un saglabāšanu veselības aprūpes sistēmā. Tik pat svarīga ir katras ārstniecības personas motivācija un vēlme strādāt izvēlētajā profesijā, darba vide, emocionālais klimats darba vietā un citi ar atalgojumu nesaistīti faktori. Arī ārstniecības personu profesionālo organizāciju pārstāvji un darba devēji vairākārt uzsvēruši, ka zemais atalgojums ir galvenais iemesls personāla migrācijai uz ārvalstīm, kur atalgojums un sociālais nodrošinājums ir ievērojami augstāks kā Latvijā.

5. Lūdzam paskaidrot, kā Latvijā tiek nodrošināta teritoriālā pieejamība valsts apmaksātai primārajai veselības aprūpei?

Personām ir tiesības brīvi izvēlēties ģimenes ārstu, pie kura reģistrēties. Ģimenes ārstam nav tiesību atteikt reģistrāciju noteiktos gadījumos, piemēram, ja personas dzīvesvieta ir ģimenes ārsta darbības teritorijā. Ģimenes ārstu darbības pamatteritorijas tiek saskaņotas ar vietējām pašvaldībām.

Papildus ģimenes ārstu praksēm, teritorijās, kurās ir nepietiekams ģimenes ārstu pakalpojumu sniedzēju nodrošinājums un apgrūtināta veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, NVD slēdz līgumu ar pašvaldībām par primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu feldšerpunktos, kuros strādā sertificēts ārsta palīgs (feldšeris).

Jaunu ģimenes ārstu prakses atvēršana tiek vērtēta atbilstoši deklarēto iedzīvotāju skaitam teritorijā, esošās ģimenes ārstu prakses lielumam (pēc praksē reģistrēto pacientu skaita), ārstu pieejamībai un pašvaldības ieinteresētībai. Šobrīd ģimenes ārstu pieejamība tiek vērtēta atbilstoši iedzīvotāju skaitam, lai nodrošinātu optimālu prakses lielumu (vidēji 1800 reģistrētie pacienti) un tādējādi prakses pastāvēšanu un efektīvu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

6. Lūdzam uzskaitīt, kādi ir konkrētie kritēriji, kas nosaka “veselības aprūpes pieejamību”?

7. Kas ir atbildīgs par šo kritēriju izpildes pārbaudi? Kā tā tiek īstenota?

Šobrīd normatīvo aktu regulējumā netiek noteikti konkrēti kritēriji terminam “veselības aprūpes pieejamība”.

8. Kā ir sadalīta atbildība un kompetence primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā starp valsti un pašvaldībām?

No veselības aprūpei paredzētiem valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi. Valsts līmenī tiek veikts pakalpojumu teritoriālais plānojums, savukārt pašvaldību kompetencē ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību.

9. Kā tiek īstenota ģimenes ārstu gada darbības novērtēšana?

Ģimenes ārstu gada darbības novērtēšana tiek veikta atbilstoši MK noteikumu Nr.1529 14.pielikumam “Ģimenes ārsta gada darbības novērtēšanas un maksājuma sadales metodika”, kurā norādītas būtiskākās gada darbības jomas (profilakse, pacientu ar hroniskām saslimšanām aprūpe, veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu efektivitātes paaugstināšana – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu izbraukumu skaita vērtējums pie ģimenes ārsta

pacienti, ģimenes ārstu veikto manipulāciju un papildu pakalpojumu daudzveidība), kā arī sasniedzamie kvalitātes kritēriju rādītāji. NVD apkopo vadības informācijas sistēmā ievadīto informāciju par katram pacientam novērtējamā gada laikā sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un katram ģimenes ārstam nosaka kvalitātes rādītājus atbilstoši MK noteikumu Nr.1529 14.pielikumā 1.punktā noteiktajam, salīdzina ar šī pielikuma 2.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un aprēķina ģimenes ārstam izmaksājamo naudas summu par kvalitātes rādītājiem.

10. *Vai uzskatāt šo darbības novērtēšanas metodiku par veiksmīgu un ģimenes ārstu darbības efektivitāti veicinošu? Lūdzam to pamatot.*

Ģimenes ārstu gada novērtējums ietekmē ģimenes ārsta ienākumus, līdz ar to ģimenes ārsti ir finansiāli ieinteresēti izpildīt noteiktos kvalitātes kritērijus.

11. *Jūsaprāt, vadoties no kādiem konkrētiem kritērijiem būtu jāvadās veidojot metodiku ģimenes ārstu darbības izvērtēšanai?*

Veselības ministrija ir uzsākusi darbu pie ģimenes ārstu prakses satura (veicamo pasākumu) definēšanas.

12. *Lūdzam iesniegt ģimenes ārstiem paredzēto maksājumu sadales metodiku, un to kā tiek noteikta ģimenes ārstu paveiktā darba apmaksā?*

Ģimenes ārstu maksājumu metodika noteikta MK noteikumu Nr.1529 10.pielikumā "Fiksētās piemaksas un maksājumi ģimenes ārstam un feldšerpunktam". Ģimenes ārstu ienākumus veido tādi maksājumi kā:

- Pamatmaksājums (kapitācijas nauda)
- Fiksētais maksājums ģimenes ārsta praksei
- Apmaksājamās manipulācijas
- Samaksa par īslaicīgo un neregistrēto pacientu aprūpi
- Valsts kompensētā pacientu iemaksa
- Citas piemaksas (par struktūras atbilstību ģimenes ārsta praksei; profilaktiskajiem izmeklējumiem; hroniskajiem pacientiem)
- Maksājums par māsas un ārsta palīga darbības nodrošināšanu
- Par papildus pieņemšanas vietu
- Par prakses darbības nodrošināšanu lauku teritorijā
- Maksājums par gada darbības novērtējumu
- Maksājums par savlaicīgi atklātu vēzi iepriekšējā gadā

13. *Vai uzskatiet, ka esošā apmaksas sistēma veicina efektīvu ģimenes ārstu darbību un kvalitatīvu pakalpojumu? Lūdzam to pamatot.*

Šobrīd esošā apmaksas sistēma netraucē efektīvu ģimenes ārstu darbību un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, iekļaujot gan noteiktus pamatmaksājumus, gan motivējošas piemaksas.

14. *Jūsaprāt, kādas izmaiņas būtu nepieciešams veikt ģimenes ārstu apmaksas sistēmā. Pamatojiet tās.*

Šobrīd uzsāktas diskusijas ar nozares speciālistiem (ģimenes ārstiem) par iespējamām izmaiņām primārajā veselības aprūpē, ietverot tādus jautājumus kā piemēram darba organizēšanas principus.

15. *Vai atbilst patiesībai apgalvojumi, ka ģimenes ārstu darbības kvalitātes rādītāji tiek rēķināti, izmantojot nevis reālo iedzīvotāju (pacientu) skaitu, bet gan iekļaujot tajā arī Latvijā neesošos, jau citās valstīs deklarētos Latvijas iedzīvotājus? Lūdzam to pamatot.*

Atbilstoši MK noteikumu Nr.1529 14.pielikuma 4.5.punktam kvalitātes rādītāju aprēķinos netiek vērtētas bloķētās personas.

16. *Kādēļ ģimenes ārstu darbības kvalitātes vērtēšanas kritērijos ir iekļauti rādītāji, kuriem nav sakara ar paša ģimenes ārsta darbību (piemēram: onkocitoloģiskā apskate, kuru veic ginekologi)?*

Tādēļ, ka ģimenes ārsti veic būtisku skīninga uzraudzības lomu savu pacientu veselības aprūpē un var būtiski ietekmēt valsts organizētā vēža skrīninga aptveres rādītājus, kā arī virzīt sievietes veikt izmeklējumu, ja tas paredzēts, taču nav veikts, tādejādi ietekmējot savlaicīgu onkoloģisko saslimšanu agrīnu diagnostiku.

17. *Pacientu profilaktiskās apskates, ko Veselības ministrija savos politikas plānošanas dokumentos ir definējusi kā būtisku pasākumu, lai veselības sistēma būtu vērsta nevis uz ielaistu slimību ārstēšanu, bet savlaicīgu slimību diagnostiku un slimību profilaksi, nav iekļautas ģimenes ārstu darba novērtēšanas kritēriju skaitā un par to veikšanu ģimenes ārstam nav paredzēta samaksa. Valsts kontrole revīzijas laikā ir konstatējusi, ka profilaktiskā apskate veikta tikai 29% personu, kas reģistrējušās pie ģimenes ārstiem, turklāt no izlasē iekļautajiem 79 ģimenes ārstiem 15 ārsti saviem pacientiem profilaktisko apskati nav veikuši vispār.*

Vai uzskatāt šādu situāciju par veselības politikas mērķiem atbilstošu?

Ģimenes ārstu gada darbības novērtējumā iekļauti kritēriji pieaugušo iedzīvotāju profilaktiskajām apskatēm.

18. *Kādus pasākumus plānojat veikt, lai nodrošinātu to, ka veselības sistēma būtu vērsta nevis uz ielaistu slimību ārstēšanu, bet savlaicīgu slimību diagnostiku un slimību profilaksi?*

Būtiska loma slimību profilaksē ir iedzīvotāju prasmēm un zināšanām veselību ietekmējošos jautājumos, līdz ar to paredzēti kompleksi slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlābāt pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros.

19. *Veselības ministrijas politikas plānošanas dokumentos ir noteikts, ka lielāko daļu iedzīvotāju veselības problēmu var atrisināt ģimenes ārsti, nosūtot pacientus pie speciālista tikai tad, ja ģimenes ārsts nespēj palīdzēt. Taču šāds kritērijs ģimenes ārsta gada darbības novērtēšanas metodikā nav iekļauts. Ģimenes ārstu nosūtījumu skaitam pie sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem ir tendence pieaugt.*

Jūsaprāt, cik lielā mērā tas ir saistīts ģimenes ārstu darbības kvalitātes pasliktināšanos, un cik lielā mērā ar valsts iedzīvotāju kopējā veselības stāvokļa pasliktināšanos?

20. *Lūdzam uzskaitīt galvenos pasākumus, kas būtu veicami, lai uzlabotu ģimenes ārstu darba efektivitāti?*

Veselības ministrija ir uzsākusi darbu pie ģimenes ārstu prakses satura (veicamo pasākumu) definēšanas.

21. *Viens no ģimenes ārsta darba kvalitātes rādītājiem ir organizētā vēža skrīninga datu uzraudzība pie ģimenes ārsta reģistrētajiem pacientiem. Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam izstrādē ir norādīts, ka nepieciešams turpināt esošās programmas, tās efektīvāk realizēt, palielinot aptveri, kā arī palielināt ģimenes ārsta atbildību attiecībā uz veiktajiem skrīninga pasākumiem praksē reģistrētiem pacientiem. Izvērtējot iesniegtos datus par gada darbības novērtējuma mainīgā maksājuma aprēķinu ģimenes ārstiem, revīzijā konstatēts, ka, piemēram, 2013.gadā no 1315 ģimenes ārstiem 979 (74 %) ģimenes ārstiem par mamogrāfijas un dzemdes kakla vēža skrīninga datu uzraudzību un 806 (61 %) ģimenes ārstiem par veikto slēpto asiņu testu aptveres datu uzraudzību izmaksājamā summa ir bijusi 0 euro, savukārt 2014.gadā no 1302 ģimenes ārstiem 1058 (81 %) ģimenes ārstiem par mamogrāfijas un dzemdes kakla vēža skrīninga datu uzraudzību un 747 (57 %) ģimenes ārstiem par veikto slēpto asiņu testu aptveres datu uzraudzību izmaksājamā summa ir bijusi 0 euro.*

Vai uzskatāt šādus rezultātus par veselības politikas mērķiem atbilstošiem? Kādus pasākumus plānojat veikt, lai to nodrošinātu?

Šobrīd tiek vērtēts vēža skrīninga organizēšanas process, identificētas problēmas un to cēloņi, kā arī tiek meklēti efektīvākie risinājumi skrīninga procesa un skrīninga aptveres populācijā uzlabošanai.

22. Veselības ministrija revīzijā sniedza informāciju, ka uz 31.12.2015. līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu bija 1329 ģimenes ārsti, no tiem 339 ģimenes ārstiem (25,5 %) reģistrēto pacientu skaits uz 01.09.2015. pārsniedza 1800 pacientus. No šiem 339 ģimenes ārstiem 150 ģimenes ārstiem reģistrēto pacientu skaits bija 1801–2000, 181 ģimenes ārstam – 2001–3000, septiņiem ģimenes ārstiem – 3001–4000 un vienam ģimenes ārstam – 6738 pacienti.

Vai, Jūsaprāt, šādā situācijā, kad vienam ģimenes ārstam ir vairāki tūkstoši pacientu, ir iespējams veikt kvalitatīvu pacientu aprūpi? Vai esat veikuši pārbaudes, lai par to pārliecinātos?

Minētais jautājums skatāms kontekstā ar sniegto primārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, un šobrīd nav pierādīta tieša korelācija starp pasliktinātu primārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un lielu reģistrēto pacientu skaitu, tāpat vērtējama saņemto sūdzību attiecība.

Veselības ministre

(paraksts*)

A. Čakša

Laika zīmogs:
01.03.2014.

Skuja, 67876189
liene.skuja@vm.gov.lv



Veselības ministrija

Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, tālr. 67876000, fakss 67876002, e-pasts vm@vm.gov.lv, www.vm.gov.lv

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā Nr. 01-11.1/972

Uz 23.02.2017 Nr.622.12/1-68-12/17

**Latvijas Republikas Saeimas
administrācijai**

*Par atbildi uz Saeimas deputātu jautājumu
Nr. 273/J12*

Atbildot uz Latvijas Republikas Saeimas administrācijas 2017.gada 23.februāra vēstuli Nr. 622.12/1-68-12/17, sniedzu atbildes uz Latvijas Republikas Saeimas deputātu jautājumu Nr. 273/J12.

1.Saskaņā ar ES fondu normatīvo regulējumu un noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu, projekta finansējuma attiecināmību izvērtē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA). Informējam, ka CFLA ir izvērtējusi vienošanās Nr.DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008/002 “E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība” ietvaros Nacionālā veselības dienesta 2016.gada 6.janvārī iesniegto maksājuma pieprasījumu un tā pamatotību, ņemot vērā noslēgtos līgumus Nr.1 – Nr.10 un saistītos pieņemšanas – nodošanas aktus, un pieņēmusi lēmumu par neatbilstību konstatēšanu, atzīstot izdevumus 124 131.71 EUR apmērā par neatbilstoši veiktiem. Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra protokola Nr.50 36.§ 6.punkts (turpmāk – MK protokols) nosaka, ka gadījumos, kad konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi valsts budžeta iestādes īstenojamā projektā apmērā virs 120 EUR, attiecīgā iestāde veic dienesta pārbaudi atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 35.panta pirmajai daļai un pēc dienesta pārbaudes atzinuma saņemšanas, ja nepieciešams, ierosina disciplinārlietu pret atbildīgajām amatpersonām un pārvaldes amatpersonām. Veselības ministrijas uzdevumā un pamatojoties uz MK protokolu, Dienesta pārbaudi par ES fondu projekta ietvaros konstatētajām neatbilstībām veicis Nacionālais veselības dienests un secinājis, ka neviena no Nacionālā veselības dienesta amatpersonām

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

SANĒMIS
Latvijas Republikas Saeimā
02.03.2017. plkst. 8:00
Nr. 1/68-12/17

nav veikusi apzinātu, prettiesisku darbību ar mērķi nodarīt valsts interesēm zaudējumus vai citādu kaitējumu, bet ir rīkojusies atbilstoši normatīvajam regulējumam un attiecīgajai situācijai, izvēloties efektīvāko veidu projekta un noslēgto līgumu izpildei.

2. Līgumu un rēķinu kopijas pievienotas pielikumā.

Pielikumā:

1. Starp Nacionālo veselības dienestu un SIA "Lattelecom" noslēgto līgumu Nr.1-Nr.10 kopijas uz 43 lpp.

2. SIA "Lattelecom" iesniegto rēķinu kopijas Nacionālajam veselības dienestam uz 11 lpp.

Veselības ministre

(paraksts*)

Anda Čakša

Laika zīmogs:
01.03.2014.

Boltāne, 67876154

Laura.Boltane@vm.gov.lv

Pasūtītāja vienošanās uzskaites
Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-1

Izpildītāja vienošanās uzskaites
Nr. LTC-14-001927

2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās
par Vienotās veselības nozares informācijas
sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)

LĪGUMS Nr.1

par Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)

Rīgā,

2014.gada 30.decembrī

Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pārstāv direktors Māris Taube, no vienas puses, un

SIA „Lattelecom” (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar 2014.gada 14.jūlija pilnvaru Nr.28-3/45 pārstāv izpilddirektors Juris Gulbis, no otras puses,

abi turpmāk kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses,

slēgta konkursa “Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšana” (Nr. VM NVD 2014/3 ERAF (turpmāk – konkurss) rezultātā noslēgtās vispārīgās vienošanās (turpmāk – Vienošanās) ietvaros,

pamatojoties uz E-veselības 2.kārtas valdes, kura izveidota ar Pasūtītāja 2013.gada 9.septembra rīkojumu Nr.04.1-2/243, 2014.gada 6.novembra sēdē apstiprināto pasūtījumu grozu,

ievērojot, ka šajā līgumā ir atrunāti darījuma speciālie noteikumi (darījuma slēdzēji, piegādājamo konkrēto preču apraksts, pasūtījuma summa, piegādes termiņi, garantijas termiņi u.tml.), savukārt, vispārīgie noteikumi ietverti Vienošanās,

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas, ne ilgāk kā četru mēnešu laikā no šī Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, veikt 0.posma (1.kārtas sistēmas lietojamības testēšana, lietojamības uzlabojumu identificēšana un lietojamības uzlabojumu izstrāde) realizāciju, saskaņā ar Vienošanās 1.pielikumu ”Tehniskās specifikācijas kopums” (turpmāk – Vienošanās 1.pielikums), Vienošanās 2.pielikumu „Izpildītāja piedāvājums, tai skaitā tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Vienošanās 2.pielikums), kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vienošanās noteikumiem (turpmāk – Pakalpojums).
- 1.2. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma garantijas apkalpošanu Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas garantijas apkalpošanas ietvaros saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem.

2. Līguma apmaksas kārtība un summa

- 2.1. Pakalpojuma pieņemšana un maksājumi tiek veikti saskaņā ar kārtību, kas noteikta ar Vienošanos, pēc Pakalpojuma akceptēšanas, atbilstoši parakstītam pieņemšanas – nodošanas aktam un pēc rēķina saņemšanas.
- 2.2. Par Pakalpojuma nodrošināšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam ne vairāk kā EUR 59 200 (piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti euro, 00 centi) bez PVN.

Cīlvēkdienas likme tiek noteikta atbilstoši Vienošanās 2.pielikumam. PVN likme tiek piemērota atbilstoši rēķina izrakstīšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- 2.3. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atskaites par Pakalpojuma realizēšanai patērēto laiku un veiktajiem darbiem saistībā ar lietojamības testēšanu un lietojamības uzlabojumu identificēšanu, iesniedzot iknedēļas progresa ziņojumu, atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma „Tehniskā specifikācija Nefunkcionālās un organizatoriskās prasības” (turpmāk – Vienošanās 1.3.pielikums) prasībai ORG-15 „Progresa ziņojumi”.
- 2.4. Atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma prasībai ORG-02 „0.posms - 1.kārtas Sistēmas lietojamības testēšana”, Lietojamības testēšanas un lietojamības uzlabojumu identificēšanas rezultātā Izpildītājs sagatavo un saskaņo ar Pasūtītāju lietojamības uzlabojumu izstrādi.
- 2.5. Katrs lietojamības uzlabojums tiek apstiprināts ar Pušu saskaņotu izmaiņu pieprasījumu, atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikuma prasībai ORG-38 „Sistēmas lietojamības uzlabojumu izpilde”, un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.

3. Pušu attiecību regulējums

Līguma izpildē tiek piemēroti visi Vienošanās noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā Līguma noteikumiem. Vienošanās ietvertais regulējums attiecināms uz Līgumu it kā būtu Līguma regulējums.

4. Citi noteikumi

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
- 4.2. Līguma termiņu var pagarināt un Līgumā izmaiņas veikt, ievērojot Vienošanās nosacījumus.
- 4.3. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Katrai pusei ir 1 (viens) Līguma eksemplārs.

5. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs

Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Valsts kase, TREL22

Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
Juridiskā adrese: Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011;
Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV05HABA000140X040000
AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22

M.Taube



J.Gulbis



Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

L. Freimane

Astra Cīrule

Pasūtītāja vienošanās uzskaites
Nr.VM NVD 2014/3 ERAF-2

Izpildītāja vienošanās uzskaites
Nr.LTC-14-001928

2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās
par Vienotās veselības nozares informācijas
sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)

LĪGUMS Nr.2

par Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)

Rīgā,

2014.gada 30.decembrī

Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pārstāv direktors Māris Taube, no vienas puses, un

SIA „Lattelecom” (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar 2014.gada 14.jūlija pilnvaru Nr.28-3/45 pārstāv izpilddirektors Juris Gulbis, no otras puses,

abi turpmāk kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses,

slēgta konkursa “Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšana” (Nr. VM NVD 2014/3 ERAF (turpmāk – konkurss) rezultātā noslēgtās vispārīgās vienošanās (turpmāk – Vienošanās) ietvaros,

pamatojoties uz E-veselības 2.kārtas valdes, kura izveidota ar Pasūtītāja 2013.gada 9.septembra rīkojumu Nr.04.1-2/243, 2014.gada 6.novembra sēdē apstiprināto pasūtījumu grozu,

ievērojot, ka šajā līgumā ir atrunāti darījuma speciālie noteikumi (darījuma slēdzēji, piegādājamo konkrēto preču apraksts, pasūtījuma summa, piegādes termiņi, garantijas termiņi u.tml.), savukārt vispārīgie noteikumi ietverti Vienošanās,

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas līdz 2015.gada 5.maijam veikt „2.posms – 2.kārtas Sistēmas vēlamā funkcionālo prasību izpilde un to akcepttestēšana” prasību grupas PNI-V-3 realizāciju, saskaņā ar Vienošanās 1.pielikumu ”Tehniskās specifikācijas kopums” (turpmāk – Vienošanās 1.pielikums), Vienošanās 2.pielikumu „Izpildītāja piedāvājums, tai skaitā tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Vienošanās 2.pielikums) un šī Līguma pielikumiem, kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vienošanās noteikumiem (turpmāk – Pakalpojums).
- 1.2. Izpildītājs nodrošina izpildītā Pakalpojuma garantijas apkalpošanu Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas garantijas apkalpošanas ietvaros saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem.

2. Līguma apmaksas kārtība un summa

- 2.1. Pakalpojuma pieņemšana un maksājumi tiek veikti saskaņā ar kārtību, kas noteikta ar Vienošanās, pēc Pakalpojuma akceptēšanas, atbilstoši parakstītam pieņemšanas – nodošanas aktam un pēc rēķina saņemšanas.
- 2.2. Par Pakalpojuma nodrošināšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam EUR 37888 (trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro, 00 centi) bez

PVN. PVN likme tiek piemērota atbilstoši rēķina izrakstīšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Pušu attiecību regulējums

Līguma izpildē tiek piemēroti visi Vienošanās noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā Līguma noteikumiem. Vienošanās ietvertais regulējums attiecināms uz Līgumu it kā būtu Līguma regulējums.

4. Citi noteikumi

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
- 4.2. Līguma termiņu var pagarināt un Līgumā izmaiņas veikt, ievērojot Vienošanās nosacījumus.
- 4.3. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Katrai pusei ir 1 (viens) Līguma eksemplārs. Līgumam ir pievienoti 1 (viens) pielikums, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa:

1. pielikums – Pasūtījuma grozs un tā finanšu piedāvājums.

5. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs

Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Valsts kase, TREL22

Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
Juridiskā adrese: Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011;
Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV05HABA000140X040000
AS „Swedbank”, SWIFT: HABA22

M. Taube



J. Gulbis



Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja

Linda Freimane

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Mārtiņš Smilga

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
direktore

Assne Orute

1.pielikums
 2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās
 par Vienotās veselības nozares informācijas
 sistēmas darbības paplašināšanu
 (iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)
 2014.gada 30.decembra Līgumam Nr.2

Pasūtījuma grozs un tā finanšu piedāvājums

| Prasības grupa | Prasība | Prasības nosaukums | Cena bez PVN, euro |
|----------------|---------|--|--------------------|
| PNI-V-3 | | | 37888.00 |
| PNI-V-3 | PNI-08 | Slēgto un anulēto DNL datu nodošana VSAA | 0.00 |
| PNI-V-3 | PNI-09 | Slēgto un anulēto DNL datu nodošana VID | 22792.00 |
| PNI-V-3 | PNI-14 | Darbnespējas lapas uzlabojumi | 15096.00 |
| KOPĀ | | | 37888.00 |

Pasūtītājs

Nacionālais veselības dienests
 Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
 Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
 Reģistrācijas Nr: 90009649337
 Norēķinu konts:
 LV65TREL2290674065000
 Valsts kase, TREL LV22

Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
 Juridiskā adrese: Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011;
 Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
 Reģistrācijas Nr: 90009649337
 Norēķinu konts:
 LV05HABA000140X040000
 AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22

M.Taube



J.Gulbis



Nacionālā veselības dienesta
 E-veselības un starptautiskās
 sadarbības departamenta
 E-veselības un standartu nodaļas
 Projektu vadītāja
Linda Freimane

Nacionālā veselības dienesta
 E-veselības un starptautiskās
 sadarbības departamenta
 Projekta vadītāja
Martiņš Smilga

(Faint text and signature)

Pasūtītāja līguma uzskaites
Nr.VM NVD 2014/3 ERAF-3

Izpildītāja līguma uzskaites
Nr. LTC-15-000/43

2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās
par Vienotās veselības nozares informācijas
sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)

LĪGUMS Nr.3

par Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)

Rīgā,

2015.gada 28.janvārī

Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” un Veselības ministrijas 2014.gada 19.decembra rīkojumu Nr.13.3-04/420 „Par I.Milaševiču” pārstāv direktora p.i. Inga Milaševiča, no vienas puses, un

SIA „Lattelecom” (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar 2015.gada 26.janvāra pilnvaru Nr.2-7/58 pārstāv Aleksejs Beloglazovs, no otras puses,

abi turpmāk kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses,

slēgta konkursa “Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšana” (Nr. VM NVD 2014/3 ERAF (turpmāk – konkurss) rezultātā noslēgtās vispārīgās vienošanās (turpmāk – Vienošanās) ietvaros,

pamatojoties uz E-veselības 2.kārtas valdes, kura izveidota ar Pasūtītāja 2013.gada 9.septembra rīkojumu Nr.04.1-2/243, 2014.gada 6.novembra un 2015.gada 8.janvāra sēdē apstiprināto pasūtījumu grozu, kā arī Izpildītāja 2014.gada 5.novembra vēstuli Nr.015128 „Par finanšu piedāvājumu iepirkumā ID Nr.VM NVD 2014/3 ERAF” un 2015.gada 27.janvāra vēstuli Nr.LTT-K-15-65 „Apliecinājums”,

ievērojot, ka šajā līgumā ir atrunāti darījuma speciālie noteikumi (darījuma slēdzēji, piegādājamo konkrēto preču apraksts, pasūtījuma summa, piegādes termiņi, garantijas termiņi u.tml.), savukārt vispārīgie noteikumi ietverti Vienošanās,

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas līdz 2015.gada 28.jūnijam veikt Līguma 1.pielikumā noteiktā pasūtījuma groza realizāciju, saskaņā ar Vienošanās 1.pielikumu “Tehniskās specifikācijas kopums” (turpmāk – Vienošanās 1.pielikums), Vienošanās 2.pielikumu „Izpildītāja piedāvājums, tai skaitā tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Vienošanās 2.pielikums) un šī Līguma pielikumiem, kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vienošanās noteikumiem (turpmāk – Pakalpojums).
- 1.2. Izpildītājs nodrošina izpildītā Pakalpojuma garantijas apkalpošanu Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas garantijas apkalpošanas ietvaros saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem.

2. Līguma apmaksas kārtība un summa

- 2.1. Pakalpojuma pieņemšana un maksājumi tiek veikti saskaņā ar kārtību, kas noteikta ar Vienošanās, pēc Pakalpojuma akceptēšanas, atbilstoši parakstītam pieņemšanas – nodošanas aktam un pēc rēķina saņemšanas.
- 2.2. Par Pakalpojuma nodrošināšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam EUR 198650.16 (viens simts deviņdesmit astoņi tūkstoši seši simti piecdesmit euro, 16 centi) bez PVN. PVN likme tiek piemērota atbilstoši rēķina izrakstīšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Pušu attiecību regulējums

Līguma izpildē tiek piemēroti visi Vienošanās noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā Līguma noteikumiem. Vienošanās ietvertais regulējums attiecināms uz Līgumu it kā būtu Līguma regulējums.

4. Citi noteikumi

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
- 4.2. Līguma termiņu var pagarināt un Līgumā izmaiņas veikt, ievērojot Vienošanās nosacījumus.
- 4.3. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Katrai pusei ir 1 (viens) Līguma eksemplārs. Līgumam ir pievienoti 1 (viens) pielikums, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa:

1. pielikums – Pasūtījuma grozs un tā finanšu piedāvājums.

5. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs

Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Valsts kase, TREL22

I.Milaševiča



Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
Juridiskā adrese: Dzīrmavu iela 105, Rīga, LV-1011;
Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV05HABA000140X040000
AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22

A.Beloglazovs



Nacionālais veselības dienests
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors
Martīņš Smilga

Nacionālais veselības dienests
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Prefektu vadītāja

Linda Freimane

1.pielikums
 2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās
 par Vienotās veselības nozares informācijas
 sistēmas darbības paplašināšanu
 (iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)
 2015.gada __.janvāra Līgumam Nr.3

Pasūtījuma grozs un tā finanšu piedāvājums

| Prasības grupa | Prasība | Prasības nosaukums | Cena bez PVN, euro |
|----------------|---------|---|--------------------|
| EVK-O-1 | EVK-01 | Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra (PREDA) izveide EVK IS | 105779.60 |
| EVK-O-1 | EVK-14 | Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra dokumenti | 48942.80 |
| POR-O-1 | POR-03 | Slīmību profilakses un kontroles centra darbinieku darba iespējas portālā | 16103.76 |
| POR-V-1 | POR-04 | PREDA medicīnisko dokumentu datu pieejamība | 27824.00 |
| KOPĀ | | | 198650.16 |

Pasūtītājs

Nacionālais veselības dienests
 Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
 Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
 Reģistrācijas Nr: 90009649337
 Norēķinu konts:
 LV65TREL2290674065000
 Valsts kase, TREL22

Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
 Juridiskā adrese: Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011;
 Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
 Reģistrācijas Nr: 90009649337
 Norēķinu konts:
 LV05HABA000140X040000
 AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22

I.Milaševiča



A.Beloglazovs



[Handwritten signature]
 Nacionālais veselības dienests
 E-veselības un starptautiskās
 sadarbības departamenta
 Projekta vadītāja
 Martinš Smilģe

[Handwritten signature]
 Nacionālais veselības dienests
 E-veselības un starptautiskās
 sadarbības departamenta
 E-veselības un standartu nodaļas
 Projektu vadītāja
 Linda Freimane

2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās
par Vienotās veselības nozares informācijas
sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)

LĪGUMS Nr.4

par Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)

Rīgā,

2015.gada 27.janvārī

Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” un Veselības ministrijas 2014.gada 19.decembra rīkojumu Nr.13.3-04/420 „Par I.Milaševiču” pārstāv direktora p.i. Inga Milaševiča, no vienas puses, un

SIA „Latt telecom” (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar 2015.gada 26.janvāra pilnvaru Nr.2-7/58 pārstāv Aleksejs Beloglazovs, no otras puses,

abi turpmāk kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses,

slēgta konkursa “Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšana” (Nr. VM NVD 2014/3 ERAF (turpmāk – konkurss) rezultātā noslēgtās vispārīgās vienošanās (turpmāk – Vienošanās) ietvaros,

pamatojoties uz E-veselības 2.kārtas valdes, kura izveidota ar Pasūtītāja 2013.gada 9.septembra rīkojumu Nr.04.1-2/243, 2014.gada 6.novembra un 2015.gada 8.janvāra sēdē apstiprināto pasūtījumu grozu, kā arī Izpildītāja 2014.gada 5.novembra vēstuli Nr.015128 „Par finanšu piedāvājumu iepirkumā ID Nr.VM NVD 2014/3 ERAF” un 2015.gada 27.janvāra vēstuli Nr.LTT-K-15-65 „Apliecinājums”,

ievērojot, ka šajā līgumā ir atrunāti darījuma speciālie noteikumi (darījuma slēdzēji, piegādājamo konkrēto preču apraksts, pasūtījuma summa, piegādes termiņi, garantijas termiņi u.tml.), savukārt vispārīgie noteikumi ietverti Vienošanās,

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas līdz 2015.gada 28.jūnijam veikt Līguma 1.pielikumā noteiktā pasūtījuma groza realizāciju, saskaņā ar Vienošanās 1.pielikumu “Tehniskās specifikācijas kopums” (turpmāk – Vienošanās 1.pielikums), Vienošanās 2.pielikumu „Izpildītāja piedāvājums, tai skaitā tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Vienošanās 2.pielikums) un šī Līguma pielikumiem, kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vienošanās noteikumiem (turpmāk – Pakalpojums).
- 1.2. Izpildītājs nodrošina izpildītā Pakalpojuma garantijas apkalpošanu Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas garantijas apkalpošanas ietvaros saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem.

2. Līguma apmaksas kārtība un summa

- 2.1. Pakalpojuma pieņemšana un maksājumi tiek veikti saskaņā ar kārtību, kas noteikta ar Vienošanās, pēc Pakalpojuma akceptēšanas, atbilstoši parakstītam pieņemšanas – nodošanas aktam un pēc rēķina saņemšanas.
- 2.2. Par Pakalpojuma nodrošināšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam EUR 164628.72 (viens simts sešdesmit četri tūkstoši seši simti divdesmit astoņi euro, 72 centi) bez PVN. PVN likme tiek piemērota atbilstoši rēķina izrakstīšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Pušu attiecību regulējums

Līguma izpildē tiek piemēroti visi Vienošanās noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā Līguma noteikumiem. Vienošanās ietvertais regulējums attiecināms uz Līgumu it kā būtu Līguma regulējums.

4. Citi noteikumi

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
- 4.2. Līguma termiņu var pagarināt un Līgumā izmaiņas veikt, ievērojot Vienošanās nosacījumus.
- 4.3. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Katrai pusei ir 1 (viens) Līguma eksemplārs. Līgumam ir pievienoti 1 (viens) pielikums, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa:

1. pielikums – Pasūtījuma grozs un tā finanšu piedāvājums.

5. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs

Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Valsts kase, TREL22

I. Milāševiča



Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
Juridiskā adrese: Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011;
Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV05HABA000140X040000
AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22

A. Beloglazovs



Nacionālais veselības dienests
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktore

Martiņš Smiļģis

Nacionālais veselības dienests
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
veselības un standartu nodaļas
Projekta vadītāja

Linda Freimane

1.pielikums
2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās
par Vienotās veselības nozares informācijas
sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)
2015.gada __.janvāra Līgumam Nr.4

Pasūtījuma grozs un tā finanšu piedāvājums

| Prasības grupa | Prasība | Prasības nosaukums | Cena bez PVN, euro |
|----------------|---------|---|--------------------|
| IPL-O-1 | IPL-27 | INSPIRE datu apkopošana | 80834.56 |
| IPL-O-1 | IPL-28 | INSPIRE datu transformācija un ielāde ĢDS | 42943.36 |
| IPL-O-1 | IPL-29 | INSPIRE datu nodošanas regularitāte | 17051.04 |
| IPL-O-1 | IPL-30 | INSPIRE datu konfigurācija ĢDS | 16103.76 |
| POR-V-1 | POR-90 | INSPIRE datu ievade | 7696.00 |
| KOPĀ | | | 164628.72 |

Pasūtītājs

Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Valsts kase, TREL22

Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
Juridiskā adrese: Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011;
Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV05HABA000140X040000
AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22

I.Milaševiča



A.Beloglazovs



Nacionālais veselības dienests
Ē-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta

Martiņš Smilga

Nacionālais veselības dienests
Ē-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
Ē-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja

Linda Freimane

Pasūtītāja līguma uzskaites
Nr.VM NVD 2014/3 ERAF-5

Izpildītāja līguma uzskaites
Nr. LTC-15-000.344

2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās
par Vienotās veselības nozares informācijas
sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)

LĪGUMS Nr.5

par Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)

Rīgā,

2015.gada 24.februārī

Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” un Veselības ministrijas 2014.gada 19.decembra rīkojumu Nr.13.3-04/420 „Par I.Milaševiču” pārstāv direktora p.i. Inga Milaševiča, no vienas puses, un

SIA „Lattelecom” (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar 2015.gada 26.janvāra pilnvaru Nr. 2-7/58 pārstāv Aleksejs Beloglazovs, no otras puses, abi turpmāk kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses,

slēgta konkursa “Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšana” (Nr. VM NVD 2014/3 ERAF (turpmāk – konkurss) rezultātā noslēgtās vispārīgās vienošanās (turpmāk – Vienošanās) ietvaros,

pamatojoties uz E-veselības 2.kārtas valdes, kura izveidota ar Pasūtītāja 2013.gada 9.septembra rīkojumu Nr.04.1-2/243, 2014.gada 6.novembra un 2015.gada 8.janvāra sēdē apstiprināto pasūtījumu grozu, kā arī Izpildītāja 2014.gada 5.novembra vēstuli Nr.015128 „Par finanšu piedāvājumu iepirkumā ID Nr.VM NVD 2014/3 ERAF”, 2015.gada 16.februārī Izpildītāja iesniegto prasību realizācijas piedāvājumu un 2015.gada 25.februāra vēstuli Nr.LTT-K-15-129 „Apliecinājums”,

ievērojot, ka šajā līgumā ir atrunāti darījuma speciālie noteikumi (darījuma slēdzēji, piegādājamo konkrēto preču apraksts, pasūtījuma summa, piegādes termiņi, garantijas termiņi u.tml.), savukārt vispārīgie noteikumi ietverti Vienošanās, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas līdz 2015.gada 28.jūnijam veikt Līguma 1.pielikumā noteiktā pasūtījuma groza realizāciju, saskaņā ar Vienošanās 1.pielikumu “Tehniskās specifikācijas kopums” (turpmāk – Vienošanās 1.pielikums), Vienošanās 2.pielikumu „Izpildītāja piedāvājums, tai skaitā tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Vienošanās 2.pielikums) un šī Līguma pielikumiem, kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vienošanās noteikumiem (turpmāk – Pakalpojums).
- 1.2. Izpildītājs nodrošina izpildītā Pakalpojuma garantijas apkalpošanu Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas garantijas apkalpošanas ietvaros saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem.

2. Līguma apmaksas kārtība un summa

- 2.1. Pakalpojuma pieņemšana un maksājumi tiek veikti saskaņā ar kārtību, kas noteikta ar Vienošanās, pēc Pakalpojuma akceptēšanas, atbilstoši parakstītam pieņemšanas – nodošanas aktam un pēc rēķina saņemšanas.
- 2.2. Par Pakalpojuma nodrošināšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam **EUR 114 305.12** (viens simts četrpadsmit tūkstoši trīs simti pieci euro, 12 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN likme tiek piemērota atbilstoši rēķina izrakstīšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Pušu attiecību regulējums

Līguma izpildē tiek piemēroti visi Vienošanās noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā Līguma noteikumiem. Vienošanās ietvertais regulējums attiecināms uz Līgumu it kā būtu Līguma regulējums.

4. Citi noteikumi

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
- 4.2. Līguma termiņu var pagarināt un Līgumā izmaiņas veikt, ievērojot Vienošanās nosacījumus.
- 4.3. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Katrai pusei ir 1 (viens) Līguma eksemplārs. Līgumam ir pievienots 1 (viens) pielikums, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa:

1. pielikums – Pasūtījuma grozs un tā finanšu piedāvājums.

5. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs

Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Valsts kase/TRELLV22

I. Miļāševiča

Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
Juridiskā adrese: Dzirnāvu iela 105, Rīga, LV-1011;
Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
Reģistrācijas Nr: 40003052786
Norēķinu konts:
LV05HABA000140X040000
AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22

A. Beloglazovs

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
saderības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projekta vadītāja

Linda Freimane

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
saderības departamenta
Projekta vadītāja

Martīns Smilga

1.pielikums
2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās
par Vienotās veselības nozares informācijas
sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)
2015.gada 27.februāra Līgumam Nr.5

Pasūtījuma grozs un tā finanšu piedāvājums

| Prasības grupa | Prasība | Prasības nosaukums | Cena bez PVN, euro |
|----------------|---------|--|--------------------|
| POR-O-2 | POR-17 | E-recepšu izrakstīšanas ekrānformas uzlabojumi | 31576.00 |
| POR-O-2 | POR-19 | E-recepšu izrakstīšanas uzlabojumi sarakstā | 18945.60 |
| POR-O-2 | POR-20 | Izsniedzamo ĀL saraksta uzlabojumi | 6315.20 |
| POR-O-2 | POR-23 | ĀL izsniegšanas uzlabojumi | 13261.92 |
| REC-O-1 | REC-02 | Ārsta kontaktinformācija uz e-receptes | 17682.56 |
| REC-O-1 | REC-05 | Recepšu izsniegšanas brīdinājumi | 26523.84 |
| KOPĀ | | | 114 305.12 |

Pasūtītājs

Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Valsts kase, TREL22

I. Milaševiča

Izpildītājs

SIA „Latt telecom”
Juridiskā adrese: Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011;
Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
Reģistrācijas Nr: 40003052786
Norēķinu konts:
LV05HABA000140X040000
AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22

A. Beļoglazovs

Nacionālais veselības dienests
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors

Martins Smilgins

Nacionālais veselības dienests
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja

Linda Freimane

Pasūtītāja līguma uzskaites
Nr.VM NVD 2014/3 ERAF-6

Izpildītāja līguma uzskaites
Nr. LTC-15-000345

VM NVD eksemplārs

2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās
par Vienotās veselības nozares informācijas
sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)

LĪGUMS Nr.6

par Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)

Rīgā,

2015.gada 24.februārī

Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” un Veselības ministrijas 2014.gada 19.decembra rīkojumu Nr.13.3-04/420 „Par I.Milaševiču” pārstāv direktora p.i. Inga Milaševiča, no vienas puses, un

SIA „Lattelecom” (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar 2015.gada 26.janvāra pilnvaru Nr. 2-7/58 pārstāv Aleksejs Beloglazovs, no otras puses,

abi turpmāk kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses,

slēgta konkursa “Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšana” (Nr. VM NVD 2014/3 ERAF (turpmāk – konkurss) rezultātā noslēgtās vispārīgās vienošanās (turpmāk – Vienošanās) ietvaros,

pamatojoties uz E-veselības 2.kārtas valdes, kura izveidota ar Pasūtītāja 2013.gada 9.septembra rīkojumu Nr.04.1-2/243, 2014.gada 6.novembra un 2015.gada 8.janvāra sēdē apstiprināto pasūtījumu grozu, kā arī Izpildītāja 2014.gada 5.novembra vēstuli Nr.015128 „Par finanšu piedāvājumu iepirkumā ID Nr.VM NVD 2014/3 ERAF”, 2015.gada 16.februārī Izpildītāja iesniegto prasību realizācijas piedāvājumu un 2015.gada 25.februāra vēstuli Nr.LTT-K-15-129 „Apliecinājums”,

ievērojot, ka šajā līgumā ir atrunāti darījuma speciālie noteikumi (darījuma slēdzēji, piegādājamo konkrēto preču apraksts, pasūtījuma summa, piegādes termiņi, garantijas termiņi u.tml.), savukārt vispārīgie noteikumi ietverti Vienošanās, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas līdz 2015.gada 28.jūnijam veikt Līguma 1.pielikumā noteiktā pasūtījuma groza realizāciju, saskaņā ar Vienošanās 1.pielikumu “Tehniskās specifikācijas kopums” (turpmāk – Vienošanās 1.pielikums), Vienošanās 2.pielikumu „Izpildītāja piedāvājums, tai skaitā tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Vienošanās 2.pielikums) un šī Līguma pielikumiem, kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vienošanās noteikumiem (turpmāk – Pakalpojums).
- 1.2. Izpildītājs nodrošina izpildītā Pakalpojuma garantijas apkalpošanu Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas garantijas apkalpošanas ietvaros saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem.

2. Līguma apmaksas kārtība un summa

- 2.1. Pakalpojuma pieņemšana un maksājumi tiek veikti saskaņā ar kārtību, kas noteikta ar Vienošanās, pēc Pakalpojuma akceptēšanas, atbilstoši parakstītam pieņemšanas – nodošanas aktam un pēc rēķina saņemšanas.
- 2.2. Par Pakalpojuma nodrošināšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam **EUR 133 250.72** (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit euro, 72 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN likme tiek piemērota atbilstoši rēķina izrakstīšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Pušu attiecību regulējums

Līguma izpildē tiek piemēroti visi Vienošanās noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā Līguma noteikumiem. Vienošanās ietvertais regulējums attiecināms uz Līgumu it kā būtu Līguma regulējums.

4. Citi noteikumi

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
- 4.2. Līguma termiņu var pagarināt un Līgumā izmaiņas veikt, ievērojot Vienošanās nosacījumus.
- 4.3. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Katrai pusei ir 1 (viens) Līguma eksemplārs. Līgumam ir pievienots 1 (viens) pielikums, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa:

1. pielikums – Pasūtījuma grozs un tā finanšu piedāvājums.

5. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs

Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Valsts kase, TREL22

I. Miļāševiča

Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
Juridiskā adrese: Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011;
Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
Reģistrācijas Nr: 40003052786
Norēķinu konts:
LV05HABA000140X040000
AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22

A. Beļoglazovs

Nacionālais veselības dienests
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja
Mārtiņš Šteins

Nacionālais veselības dienests
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja
Linda Freimane

1.pielikums
2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās
par Vienotās veselības nozares informācijas
sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)
2015.gada 24.februāra Līgumam Nr.6

Pasūtījuma grozs un tā finanšu piedāvājums

| Prasības grupa | Prasība | Prasības nosaukums | Cena bez PVN, euro |
|----------------|---------|--|--------------------|
| EVK-O-1 | EVK-07 | Datu pārbaude vakcīnu derīguma termiņam | 4736.40 |
| EVK-O-1 | EVK-08 | Datu pārbaude par veiktām vakcinācijām | 6315.20 |
| EVK-O-1 | EVK-09 | Vakcīnu norakstīšanas iemesla izveide | 1578.80 |
| EVK-O-1 | EVK-10 | Vakcīnu sēriju, numuru un derīguma termiņa datu uzturēšana | 4736.40 |
| POR-O-5 | POR-77 | Vakcinācijas moduļa uzlabojumi | 35365.12 |
| POR-O-5 | POR-79 | Korekciju veikšana vakcīnu pasūtījuma formā | 42943.36 |
| POR-O-5 | POR-80 | Vakcinācijas pārskata korekciju apstiprināšana vai noraidīšana | 15788.00 |
| POR-O-5 | POR-81 | Pacienta plānoto vakcināciju attēlošana | 13577.68 |
| POR-O-5 | POR-82 | Revakcinācijas datuma labošana | 8209.76 |
| KOPĀ | | | 133 250.72 |

Pasūtītājs

Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Valsts kase, TREL22

I. Milaševiča

Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
Juridiskā adrese: Dzirnāvu iela 105, Rīga, LV-1011;
Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
Reģistrācijas Nr: 40003052786
Norēķinu konts:
LV05HABA000140X040000
AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22

A.Beloglazovs

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja

Linda Freimane

Nacionālais veselības dienests
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
Linda Freimane

Martinš Smilgītis

2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās
par Vienotās veselības nozares informācijas
sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)

LĪGUMS Nr.7

par Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)

Rīgā,

2015.gada 16.martā

Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pārstāv direktore Daina Mūrmane - Umbraško, no vienas puses, un

SIA „Lattelecom” (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar 2014.gada 3.aprīļa pilnvaru Nr.28-3/41 pārstāv izpilddirektors Juris Gulbis, no otras puses, abi turpmāk kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses, slēgta konkursa “Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšana” (Nr. VM NVD 2014/3 ERAF (turpmāk – konkurss) rezultātā noslēgtās vispārīgās vienošanās (turpmāk – Vienošanās) ietvaros,

pamatojoties uz E-veselības 2.kārtas valdes, kura izveidota ar Pasūtītāja 2013.gada 9.septembra rīkojumu Nr.04.1-2/243, 2014.gada 6.novembra un 2015.gada 8.janvāra sēdē apstiprināto pasūtījumu grozu, kā arī Izpildītāja 2014.gada 5.novembra vēstuli Nr.015128 „Par finanšu piedāvājumu iepirkumā ID Nr.VM NVD 2014/3 ERAF”, 2015.gada 2.martā Izpildītāja iesniegto prasību realizācijas piedāvājumu un 2015.gada 11.marta vēstuli Nr.LTT-K-15-163 „Apliecinājums”,

ievērojot, ka šajā līgumā ir atrunāti darījuma speciālie noteikumi (darījuma slēdzēji, piegādājamo konkrēto preču apraksts, pasūtījuma summa, piegādes termiņi, garantijas termiņi u.tml.), savukārt vispārīgie noteikumi ietverti Vienošanās, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas līdz 2015.gada 28.jūnijam veikt Līguma 1.pielikumā noteiktā pasūtījuma groza realizāciju, saskaņā ar Vienošanās 1.pielikumu “Tehniskās specifikācijas kopums” (turpmāk – Vienošanās 1.pielikums), Vienošanās 2.pielikumu „Izpildītāja piedāvājums, tai skaitā tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Vienošanās 2.pielikums) un šī Līguma pielikumiem, kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vienošanās noteikumiem (turpmāk – Pakalpojums).
- 1.2. Izpildītājs nodrošina izpildītā Pakalpojuma garantijas apkalpošanu Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas garantijas apkalpošanas ietvaros saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem.

2. Līguma apmaksas kārtība un summa

- 2.1. Pakalpojuma pieņemšana un maksājumi tiek veikti saskaņā ar kārtību, kas noteikta ar Vienošanās, pēc Pakalpojuma akceptēšanas, atbilstoši parakstītam pieņemšanas – nodošanas aktam un pēc rēķina saņemšanas.
- 2.2. Par Pakalpojuma nodrošināšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam **EUR 290 438.72** (divi simti deviņdesmit tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi euro, 72 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN likme tiek piemērota atbilstoši rēķina izrakstīšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Pušu attiecību regulējums

Līguma izpildē tiek piemēroti visi Vienošanās noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā Līguma noteikumiem. Vienošanās ietvertais regulējums attiecināms uz Līgumu it kā būtu Līguma regulējums.

4. Citi noteikumi

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
- 4.2. Līguma termiņu var pagarināt un Līgumā izmaiņas veikt, ievērojot Vienošanās nosacījumus.
- 4.3. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Katrai pusei ir 1 (viens) Līguma eksemplārs. Līgumam ir pievienots 1 (viens) pielikums, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa:

1. pielikums – Pasūtījuma grozs un tā finanšu piedāvājums.

5. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs


Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Valsts kase, TREL22

Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
Juridiskā adrese: Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011;
Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
Reģistrācijas Nr: 40003052786
Norēķinu konts:
LV05HABA000140X040000
AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22


D. Mūrmane




J. Gulbis


Nacionālais veselības dienests
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departaments
E-veselības un standartu nodaļas
Projektu vadītāja

Linda Freimane

I.pielikums
 2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās
 par Vienotās veselības nozares informācijas
 sistēmas darbības paplašināšanu
 (iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)
 2015.gada 16.marta Līgumam Nr.7

Pasūtījuma grozs un tā finanšu piedāvājums

| Prasības grupa | Prasība | Prasības nosaukums | Cena bez PVN, euro |
|----------------|---------|---|--------------------|
| EPK-O-1 | EPK-04 | Mani vizuālās diagnostikas dati | 25 892.32 |
| EVK-O-1 | EVK-15 | Vizuālās diagnostikas izmeklējuma (Study) CDA | 4 736.40 |
| EVK-O-1 | EVK-16 | Vizuālās diagnostikas slēdziena (Report) CDA | 4 736.40 |
| IPL-O-1 | IPL-31 | DICOM metadatu savācējs | 41 048.80 |
| IPL-O-1 | IPL-32 | DICOM oriģināldatu izgūšana | 31 576.00 |
| IPL-O-1 | IPL-33 | Izmeklējumu lejupielādes pakotņu veidotājs | 75 782.40 |
| IPL-O-1 | IPL-34 | Attēlu apskatīšanas rīks (Viewer) | 75 782.40 |
| IPL-O-1 | IPL-35 | DICOM IR administrācijas interfeiss | 15 788.00 |
| SAD-V-1 | SAD-01 | Java bibliotēku izstrāde | 15 096.00 |
| KOPĀ | | | 290 438.72 |

Pasūtītājs

Nacionālais veselības dienests
 Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
 Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
 Reģistrācijas Nr: 90009649337
 Norēķinu konts:
 LV65TREL2290674065000
 Valsts kase, TREL22

Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
 Juridiskā adrese: Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011;
 Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
 Reģistrācijas Nr: 40003052786
 Norēķinu konts:
 LV05HABA000140X040000
 AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22

D.Mūrmane - Umbrāsko

J.Gulbis



Nacionālais veselības dienests
 E-veselības un starptautiskās
 sadarbības departaments
 E-veselības un standartu nodaļas
 Projekta vadītāja

Linda Freimane



Caurkocias un Nutuklitas

Handwritten signature
Lapu saraksts

3
Mugurpils veselības dienests
E-veselības un starptautiskās
saziņas departaments
E-veselības un standartu nodaļas
Projekta vadītāja
Linda Frimmane



2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās par
Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības
paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)

LĪGUMS Nr.8

par Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)

Rīgā,

2015.gada 10.aprīlī

Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pārstāv direktore Daina Mūrmane - Umbraško, no vienas puses, un

SIA „Lattelecom” (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar 2015.gada 26.janvāra pilnvaru Nr. 2-7/58 pārstāv Aleksejs Beloglazovs, no otras puses,

abi turpmāk kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses,
slēgta konkursa “Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšana” (Nr. VM NVD 2014/3 ERAF (turpmāk – konkurss) rezultātā noslēgtās vispārīgās vienošanās (turpmāk – Vienošanās) ietvaros,

pamatojoties uz E-veselības 2.kārtas valdes, kura izveidota ar Pasūtītāja 2013.gada 9.septembra rīkojumu Nr.04.1-2/243, 2014.gada 6.novembra, 2015.gada 8.janvāra un 2015.gada 27.marta sēdē apstiprināto pasūtījumu grozu, kā arī Izpildītāja 2014.gada 5.novembra vēstuli Nr.015128 „Par finanšu piedāvājumu iepirkumā ID Nr.VM NVD 2014/3 ERAF”, 2015.gada 26.martā Izpildītāja iesniegto prasību realizācijas piedāvājumu un 2015.gada 7.aprīļa vēstuli Nr.LTT-K-15-223 „Apliecinājums”,

ievērojot, ka šajā līgumā ir atrunāti darījuma speciālie noteikumi (darījuma slēdzēji, piegādājamo konkrēto preču apraksts, pasūtījuma summa, piegādes termiņi, garantijas termiņi u.tml.), savukārt vispārīgie noteikumi ietverti Vienošanās, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas līdz 2015.gada 28.jūnijam veikt Līguma 1. un 2.pielikumā noteiktā pasūtījuma groza realizāciju, saskaņā ar Vienošanās 1.pielikumu “Tehniskās specifikācijas kopums” (turpmāk – Vienošanās 1.pielikums), Vienošanās 2.pielikumu „Izpildītāja piedāvājums, tai skaitā tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Vienošanās 2.pielikums) un šī Līguma pielikumiem, kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vienošanās noteikumiem (turpmāk – Pakalpojums).
- 1.2. Izpildītājs nodrošina izpildītā Pakalpojuma garantijas apkalpošanu Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas garantijas apkalpošanas ietvaros saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem.

2. Līguma apmaksas kārtība un summa

- 2.1. Pakalpojuma pieņemšana un maksājumi tiek veikti saskaņā ar kārtību, kas noteikta ar Vienošanos, pēc Pakalpojuma akceptēšanas, atbilstoši parakstītam pieņemšanas – nodošanas aktam un pēc rēķina saņemšanas.
- 2.2. Par Pakalpojuma nodrošināšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam **EUR 88825.76** (astoņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci euro, 76 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa

(PVN). PVN likme tiek piemērota atbilstoši rēķina izrakstīšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Pušu attiecību regulējums

Līguma izpildē tiek piemēroti visi Vienošanās noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā Līguma noteikumiem. Vienošanās ietvertais regulējums attiecināms uz Līgumu it kā būtu Līguma regulējums.

4. Citi noteikumi

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
- 4.2. Līguma termiņu var pagarināt un Līgumā izmaiņas veikt, ievērojot Vienošanās nosacījumus.
- 4.3. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Katrai pusei ir 1 (viens) Līguma eksemplārs. Līgumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa:

1. pielikums – Pasūtījuma grozs un tā finanšu piedāvājums.
2. Pielikums – Sistēmas uzlabojumu izpildes un tā finanšu piedāvājums.


5. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs

Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Valsts kase, TREL22

Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
Juridiskā adrese: Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011;
Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
Reģistrācijas Nr: 40003052786
Norēķinu konts:
LV05HABA000140X040000
AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22


D. Mūrmane - Umbrāško


A. Bologlazovs




Nacionālais veselības dienests
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departaments
Mārtiņš Šmilgītis


Nacionālais veselības dienests
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departaments
E-veselības un standarta nodaļas
Projekta vadītāja
Linda Freimane

I.pielikums
2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās par
Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)
2015.gada __.aprīļa Līgumam Nr.8

Pasūtījuma grozs un tā finanšu piedāvājums


| Prasības grupa | Prasība | Prasības nosaukums | Cena NVD, bez PVN |
|----------------|---------|--------------------------------------|-------------------|
| DR-O-1 | POR-07 | Ārvalsts iedzīvotāja datu ievade | 18 629.84 |
| VK-V-1 | EVK-04 | Datu saglabāšana par ārzemniekiem | 13 320.00 |
| L-O-1 | IPL-22 | Ārvalstu pilsoņu identifikācija | 52 731.92 |
| KOPĀ | | | 84681.76 |

Pasūtītājs

Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Valsts kase, TREL22

Izpildītājs

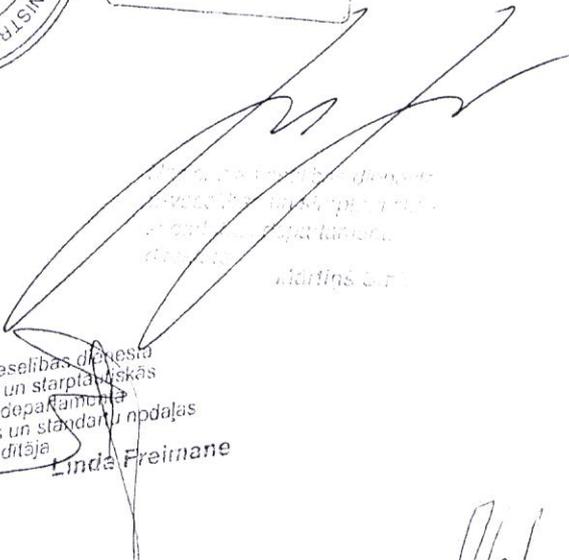
SIA „Lattelecom”
Juridiskā adrese: Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011;
Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
Reģistrācijas Nr: 40003052786
Norēķinu konts:
LV05HABA000140X040000
AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22


D.Mūrmane - Umbrāško




A.Beļoglazovs



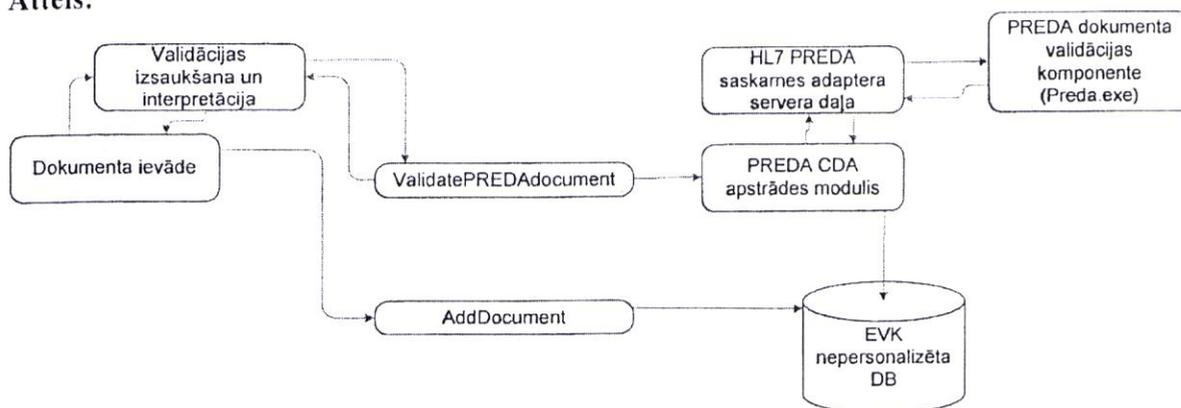

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un standartu nodaļas
Projekta vadītāja
Linda Freimane

Sistēmas uzlabojumu izpildes un tā finanšu piedāvājums

Portāls validē PREDA dokumentus, izmantojot PREDA validācijas komponenti sinhronajā režīmā.

Darba uzdevums: Realizēt sinhrono PREDA CDA dokumentu validācijas komponenti un izvietot to, ka servisu IP.

Attēls:



Apraksts:

Tiek piedāvāts realizēt PREDA CDA dokumentu validāciju, izmantojot sinhrono PREDA aplikācijas validācijas komponenti, kuru ir jāizveido un jāizvieto IP.

Dokumentu validācijas sinhronais serviss nodrošinās saņemta CDA dokumenta datu attiecināšanu uz PREDA aplikācijas ievades laukiem un PREDA aplikācijas validācijas rezultātu nosūtīšanu, servisa atbildes veidā.

Portālam jānodrošina validācijas komponentes izsaukšana un tās atgriezto rezultātu interpretāciju un prezentāciju lietotājam.

PREDA validācijas komponente tiek izveidota, izmantojot PREDA aplikāciju, kas modificēta CDA dokumentu apstrādei. Komponente tiks modificēta tā, lai nodrošināt tās izmantošanas iespēju gan validācijas, gan datu saglabāšanas pielietojumā.

PREDA validācijas komponente tiks realizēta atsevišķas timekļa pakalpes veidā, un tā tiks izvietota blakus eksistējošiem EVK timekļa pakalpiem, bet atsevišķa procesa konteineri, lai nodrošinot iespēju veikt diferencēto uzvedības kontroli validācijas komponentei.

Nepieciešamas aktivitātes

Lai realizēt prasīto funkcionalitāti nepieciešams izpildīt šādas aktivitātes:

| Nr. | Aktivitāte | Apraksts | Novērtējums (c/d) |
|-----|---|---|-------------------|
| 1. | Validācijas servisa izveide | Izveidot sinhrono validācijas servisu un atbilstoši aktualizējot EVK PPS un PPA | 1 |
| 2. | PREDA aplikācijas noformēšana, ka dīl izmantošanā validācijas servisā | Izveidot validācijas dīl no PREDA aplikācijas. Optimizēt PREDA aplikāciju darbam, ka servisa sastāvdaļa. Notestēt validatora reakcijas laiku un atmiņas patēriņu. | 4 |
| 3 | Validēt CD Reģistra dokumentus | Izveidot un notestēt kodu, kas validē CD reģistra CDA dokumentus pret PREDA aplikācijas nosacījumiem. | 1 |

| Nr. | Aktivitāte | Apraksts | Novērtējums (c/d) |
|-----|---|--|-------------------|
| 4 | Validēt Narkoloģijas reģistra dokumentus | Izveidot un notestēt kodu, kas validē Narkoloģijas reģistra CDA dokumentus pret PREDA aplikācijas nosacījumiem. | 1 |
| 5 | Validēt Psihisko traucējumu reģistra dokumentus | Izveidot un notestēt kodu, kas validē Psihisko traucējumu reģistra CDA dokumentus pret PREDA aplikācijas nosacījumiem. | 1 |
| 6 | Validēt Onkoloģijas reģistra dokumentus | Izveidot un notestēt kodu, kas validē Onkoloģijas reģistra CDA dokumentus pret PREDA aplikācijas nosacījumiem. | 1 |
| 7 | Validēt Tuberkulozes reģistra dokumentus | Izveidot un notestēt kodu, kas validē Tuberkulozes reģistra CDA dokumentus pret PREDA aplikācijas nosacījumiem. | 1 |
| 8 | Validēt Arodslimību reģistra dokumentus | Izveidot un notestēt kodu, kas validē Arodslimību reģistra CDA dokumentus pret PREDA aplikācijas nosacījumiem. | 1 |
| 9 | Validēt Multiplas sklerozes reģistra dokumentus | Izveidot un notestēt kodu, kas validē Multiplas sklerozes reģistra CDA dokumentus pret PREDA aplikācijas nosacījumiem. | 1 |
| 10 | Validēt Traumu reģistra dokumentus | Izveidot un notestēt kodu, kas validē Traumu reģistra CDA dokumentus pret PREDA aplikācijas nosacījumiem. | 1 |
| 11 | Validēt Iedzimto anomāliju reģistra dokumentus | Izveidot un notestēt kodu, kas validē Iedzimto anomāliju reģistra CDA dokumentus pret PREDA aplikācijas nosacījumiem. | 1 |
| | | Kopā: | 14 |

Finanšu aprēķins

Atbilstoši piedāvājuma cilvēkdienas izmaksām – 14 cilvēkdienas * 296 EUR = **4144 EUR**

Darba uzdevuma izpildes laika grafiks

Mēs piedāvājam realizēt darba uzdevumu līdz 2015.gada 28.jūnijam.

Pasūtītājs

Nacionālais veselības dienests
 Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
 Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
 Reģistrācijas Nr: 90009649337
 Norēķinu konts:
 LV65TREL2290674065000
 Valsts kase, TREL22

Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
 Juridiskā adrese: Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011;
 Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
 Reģistrācijas Nr: 40003052786
 Norēķinu konts:
 LV05HABA000140X040000
 AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22

D.Mūrmane - Umbrāsko

A. Beloglazovs

L. Freimanis

Pasūtītāja vienošanās uzskaites
Nr.VM NVD 2014/3 ERAF-9

Izpildītāja vienošanās uzskaites
Nr. LTC-15-001122

2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās par
Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas
darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)

LĪGUMS Nr.9

par Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)

Rīgā,

2015.gada 31.jūlijā

Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” un pamatojoties uz Veselības ministrijas 2015.gada 2.jūlija rīkojumu Nr.13.3-05/219 „Par apmaksātā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu D.Mūrmanei - Umbraško” pārstāv direktora p.i. Andrejs Doveiks, no vienas puses, un

SIA „Lattelecom” (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar 2015.gada 13.aprīļa pilnvaru Nr.28-3/41 pārstāv izpilddirektors Juris Gulbis, no otras puses,

abi turpmāk kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses,

slēgta konkursa “Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšana” (Nr. VM NVD 2014/3 ERAF (turpmāk – konkurss) rezultātā noslēgtās vispārīgās vienošanās (turpmāk – Vienošanās) ietvaros,

pamatojoties uz E-veselības 2.kārtas valdes, kura izveidota ar Pasūtītāja 2013.gada 9.septembra rīkojumu Nr.04.1-2/243, 2014.gada 6.novembra, 2015.gada 8.janvāra un 30.jūlija sēdē apstiprināto pasūtījumu grozu, kā arī Izpildītāja 2014.gada 5.novembra vēstuli Nr.015128 „Par finanšu piedāvājumu iepirkumā ID Nr.VM NVD 2014/3 ERAF”, Izpildītāja 2015.gada 2.jūnijā iesniegto diagnozes iekļaušanas darbnespējas lapā prasību realizācijas piedāvājumu, Izpildītāja 2015.gada 28.jūlija vēstuli Nr.LTT-K-15-485, Izpildītāja 2015.gada 30.jūlija vēstuli Nr.LTT-K-15-490 „Apliecinājums”,

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas līdz 2015.gada 28. novembrim veikt Līguma 1.pielikumā noteiktā pasūtījuma groza un sistēmas uzlabojuma realizāciju, saskaņā ar Vienošanās 1.pielikumu ”Tehniskās specifikācijas kopums” (turpmāk – Vienošanās 1.pielikums), Vienošanās 2.pielikumu „Izpildītāja piedāvājums, tai skaitā tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Vienošanās 2.pielikums) un šī Līguma pielikumiem, kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vienošanās noteikumiem (turpmāk – Pakalpojums).
- 1.2. Izpildītājs nodrošina izpildītā Pakalpojuma garantijas apkalpošanu Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas garantijas apkalpošanas ietvaros saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem.

2. Līguma apmaksas kārtība un summa

- 2.1. Pakalpojuma pieņemšana un maksājumi tiek veikti saskaņā ar kārtību, kas noteikta ar Vienošanās, pēc Pakalpojuma akceptēšanas, atbilstoši parakstītam pieņemšanas – nodošanas aktam un pēc rēķina saņemšanas.
- 2.2. Par Pakalpojuma nodrošināšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 543080.48 euro (pieci simti četrdesmit trīs tūkstoši astoņdesmit euro, 48 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN likme tiek piemērota atbilstoši rēķina izrakstīšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Pušu attiecību regulējums

Līguma izpildē tiek piemēroti visi Vienošanās noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā Līguma noteikumiem. Vienošanās ietvertais regulējums attiecināms uz Līgumu it kā būtu Līguma regulējums.

4. Citi noteikumi

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
- 4.2. Līguma termiņu var pagarināt un Līgumā izmaiņas veikt, ievērojot Vienošanās nosacījumus.
- 4.3. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Katrai pusei ir 1 (viens) Līguma eksemplārs. Līgumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa:

1. pielikums - Nodevumu sagatavošanas un saskaņošanas kārtība;
2. pielikums - Pasūtījuma grozs un tā finanšu piedāvājums;
3. pielikums – Sistēmas uzlabojumu izpildes un tā finanšu piedāvājums.

5. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs

Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Valsts kase, TREL22

A.Doveiks

Nacionālā veselības dienesta
Direktora p.i.

Andrejs Doveiks

Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011;
Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
Reģistrācijas Nr: 40003052786
Norēķinu konts:
LV05HABA000140X040000
AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22

J.Gulbis

Nacionālā veselības dienesta
E- veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
direktors
Mārtiņš Smilga

Nacionālā veselības dienesta
E- veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības nodaļas
vadītāja

Astra Cīrule

Arturs Grīgs

Nacionālā veselības dienesta
Juridiskā atbalsta nodaļas
Jurists

L. Freimane

Vada Peļkociņš

1.pielikums

2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās par
Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas
darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)
2015.gada __.jūlija Līgumam Nr.9

Nodevumu sagatavošanas un saskaņošanas kārtība

Izpildītājs sagatavo dokumentu nodevumus saskaņā ar Kvalitātes plānu (NVD.VVIS.KVP) un Projekta pārvaldības plānu (NVD.VVIS.PPP), iesniedzot programmatūras nodevumus tiek ievērotas arī Kodēšanas vadlīnijas (NVD.VVIS.KOD.VAD) un Piegādes procedūra (NVD.VVIS.ORG.PIEG.PROC).

Izpildītājs sagatavo nodevumus Pasūtītājam pieņemšanai un Pasūtītājs izskata ne vairāk kā 2 (divās) iterācijās, izņemot 5.punktā noteiktajos gadījumos.

Pasūtītājs sagatavo iebildumus par dokumentu nodevumiem, izmantojot komentāru caurskates tabulas, kļūdu pieteikumi par programmatūras nodevumiem tiek reģistrēti Pasūtītāja JIRA sistēmā.

Izpildītāja pienākums ir novērst visus Pasūtītāja iebildumus, iesniedzot nodevumus otrajā iterācijā atkārtotai saskaņošanai.

Pasūtītāja pienākums ir atkārtoti izskatīt iesniegtos nodevumus, atbilstoši Pasūtītāja iesniegtajiem iebildumiem un Izpildītāja sniegtajām atbildēm komentāru caurskates tabulās, kā arī Pasūtītājam ir tiesības iesniegt jaunus iebildumus tikai gadījumā, ja veiktie labojumi rada ietekmi vai pretrunas uz nodevuma citām sadaļām vai iebildumi nav novērsti.

Izpildītāja pienākums ir novērst visus iebildumus, kuri ir norādīti šī pielikuma 5.punktā; Izpildītāja pienākums ir nodrošināt cilvēkresursus nodevumu sagatavošanai un labošanai, bet Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt cilvēkresursus nodevumu izskatīšanai un saskaņošanai;

Interviju organizēšanu ar trešo pušu (t.sk. iestāžu) pārstāvjiem veic Pasūtītājs, pamatojoties uz Izpildītāja pieprasījumu;

Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt Izpildītājam vismaz 8 (astoņas) stundas intervijās ar Pasūtītāja speciālistiem, lai nodrošinātu katras prasības analīzi, ja Izpildītājs to pieprasa.

šis pielikums nosaka nodevumu sagatavošanas un saskaņošanas kārtību, bet nemaina citu ienošanās noteikto tiesību un pienākumu apjomu.

Pasūtītājs

Nacionālais veselības dienests
Pilsētu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālrunis: 67043700, fakss: 67043701
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Pasts: kase, TREL LV22

Nacionālā veselības dienesta
Direktora p.i.
A.Doveikis
Andrejs Doveikis

Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
Juridiskā adrese: Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011;
Tālrunis: 67055271, fakss: 67051851
Reģistrācijas Nr: 40003052786
Norēķinu konts:
LV05HABA000140X040000
AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22

J.Gulbis

Nacionālā veselības dienesta
E-veselības un starptautiskās
sadarbības departamenta

2.pielikums

2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās par
 Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas
 darbības paplašināšanu
 (iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)
 2015.gada __.jūlija Līgumam Nr.9

Pasūtījuma grozs un tā finanšu piedāvājums

| Prasības grupa | Prasība | Prasības nosaukums | Cena bez PVN, euro |
|-----------------------|----------------|--|---------------------------|
| EPK-O-1 | EPK-01 | E-pakalpojumu realizācija | 5367.92 |
| EPK-O-1 | EPK-02 | E-pakalpojumu saņemšana par bērniem un aizbilstamajiem | 5367.92 |
| EPK-O-1 | EPK-03 | EVK ziņojumi pacientam | 9472.80 |
| EPK-O-1 | EPK-08 | Mans ģimenes ārsts | 8841.28 |
| EPK-O-1 | EPK-09 | Manas rindas valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai | 8525.52 |
| EPK-O-1 | EPK-11 | Interaktīva konsultācija pie ārsta | 24313.52 |
| EPK-O-1 | EPK-14 | Reģistrācijas un pieprasījumu formas ĀP, ĀAP un ĀI reģistriem | 5367.92 |
| EVK-V-1 | EVK-03 | Integrācija ar VDEĀVK IS | 5920.00 |
| EVK-V-3 | EVK-11 | Imunizācijas un vakcīnu pasūtījuma pārskata sagatavošana | 5920.00 |
| EVK-V-3 | EVK-12 | Vakcinācijas komplikāciju, blakusparādību ziņojuma datu uzkrāšana | 11840.00 |
| IPL-V-3 | IPL-19 | Pakalpojuma funkcionalitātes pilnveidošana | 40256.00 |
| IPL-V-4 | IPL-20 | Aizdomīgo darbību monitorings | 23384.00 |
| IPL-V-6 | IPL-38 | Tehnisko lietotāju pārvaldības papildinājumi | 5032.00 |
| POR-V-1 | POR-02 | VDEĀVK darba vietas izveide | 11248.00 |
| POR-V-2 | POR-12 | Sarakstu meklēšanas uzlabojumi | 259888.00 |
| POR-V-2 | POR-24 | ĀL izsniegšanas vēlamie uzlabojumi | 39072.00 |
| POR-O-2 | POR-26 | Ekstemporāli pagatavojamo zāļu un bezrecepšu zāļu receptes | 6315.20 |
| POR-O-3 | POR-34 | Ārstniecības personas darba vides uzlabojumi | 3473.36 |
| POR-O-3 | POR-39 | ĀI darba vides uzlabojumi | 30 312.96 |
| POR-O-3 | POR-55 | Jaundzimušā kartes datu anketes ierobežojums | 2526.08 |

| | | | |
|---------|--------|---|------------------|
| POR-V-3 | POR-53 | Pacienta darbvietas sadaļas „Vakcinācijas dati” uzlabojumi | 0.00 |
| POR-V-3 | POR-62 | Informācijas sagatavošana par iedzīvotāja nespēju ierasties tiesā | 14800.00 |
| | IP-02 | DNL un diagnozes | 9916.00 |
| | | KOPĀ | 543080.48 |

Pasūtītājs

Nacionālais veselības dienests
 Dzeņu iela 31 k-3, Rīga, LV-012;
 Tālrunis: 67043700, fakss: 67043701
 Reģistrācijas Nr: 90009649337
 Norēķinu konts: LV65TREL2290674065000
 Valsts kase, TREL22

A. Doveiks

Nacionālā veselības dienesta
 Direktora p.i.
Andrejs Doveiks

Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
 Juridiskā adrese: Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011;
 Tālrunis: 67055271, fakss: 67051851
 Reģistrācijas Nr: 40003052786
 Norēķinu konts: LV05HABA000140X040000
 AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22

J. Gulbis

L. Freimane

Nacionālā veselības dienesta
 E-veselības un starptautiskās
 sadarbības departamenta
 direktors
Mārtiņš Smilga

Nacionālā veselības dienesta
 E-veselības un starptautiskās
 sadarbības departamenta
 direktors

Mārtiņš Smilga

3.pielikums

2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās par
 Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas
 darbības paplašināšanu
 (iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)
 2015.gada __.jūlija Līgumam Nr.9

Sistēmas uzlabojumu izpildes un tā finanšu piedāvājums

| | |
|---|---|
| saukums | Izvērtējums par diagnožu lauku ieviešanu elektroniskajās darbnespējas lapās |
| gabals | DNL, EVK (diagnožu saņemšana) |
| maiņas sistēmas arhitektūrā | Nē |
| maiņas ietekmē datu maiņu ar ārējām sistēmām | Pagaidām nav identificētas. DNL datus uz VSAA/VID šie papildus lauki netiek nodoti |
| maiņas ietekmē citu gabalu funkcionalitāti | Jā |
| ņemumi, balstoties uz sībām un analīzi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izmāiņas nepieciešamas tikai DNL A un B slēgšanas procesā, t.i. slēgšanas un apskates formās. Lapu atvēršanā un anulēšanā lauki netiek pievienoti. 2. Nākotnes prasība par ārstniecības epizožu sasaisti ar DNL ir ņemta vērā tikai rekomendējoši (iestrāžu veidošanai). DNL izveidošanas vieta netiek mainīta. |

maises prasību apraksts

| maiņa | Izmāiņas apraksts |
|--|--|
| Pie darbnespējas as slēgšanas, tam ir ieviešams ādīt gnozi, kas ir pamatu darbnespējas as ieviešanai. | <p>Darbnespējas lapas slēgšanā (procesa solis „P.4.” A un B aprites procesa diagrammās - procesa kontekstu skatīt pielikumā „A. Darbnespējas lapu aprites procesu diagrammas”) jāievieš obligāta pamata diagnozes un izvēles papildu diagnozes aizpildīšana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pamata diagnoze (ārstniecības persona ievada vienu diagnozi); ▶ Papildu diagnoze (ārstniecības persona ievada papildus vienu vai vairākas diagnozes, kas attiecas uz šo darbnespēju). <p>Lauku aizpildīšanā jāizvēlas diagnozes no SSK-10 klasifikatora vai no pacientam iepriekš reģistrētajām diagnozēm.</p> <p>Vienas pamata diagnozes izvēle var būt sarežģīta vai neatrisināma gadījumos, kad slimības periods bijis ilgstošs ar dažādām komplikācijām (piemēram, gripa ->plaušu karsonis ->3. diagnoze). Šādiem gadījumiem jāizmanto iespēja norādīt papildu diagnozi.</p> <p>Papildu variants vairāku secīgu diagnožu norādīšanai ir esošās DNL aizvēršana un jaunas DNL atvēršana ar jauno diagnozi.</p> |

maiņas e-veselības sistēmā

| | |
|---|--|
| ija ieciešams Idināt DNL tāja saskarni un cīgās datu tabulas diagnozes izvēles iem. | Izmaiņas apraksts DNL ievades saskarnē, veicot DNL noslēgšanu, jāizstrādā 2 jauni izvēles lauki („Diagnoze” un „Papildu diagnoze”). Diagnožu izvēles iespējas ārstam jāatvieglo, ekrānformā attēlojot: 1) B lapas gadījumā atbilstoši saistītās A lapas diagnozi SSK-10 klasifikatora formā; 2) Pēdējā gada laikā pacientam konstatētās diagnozes ārstniecības epizodēs, attēlojot pilnu SSK-10 klasifikatoru. |
| ido aites ctavā šanai nozēm. | jaunas datu statistikas par Esošo atskaišu kopa SPKC jāpapildina ar jaunām atskaitēm par SSK-10 klasifikācijai atbilstošu diagnožu statistiku darbnespējas lapās. Atskaitēs iekļaujamo informāciju jāprecizē prasību analīzes fāzē ar atbildīgajām institūcijām NVD un SPKC. |

āvētie risinājumi

iespējas lapas slēgšanas un apskates formas:

Risinājums

anas dati

Slēgšanas datums: 31.03.2015

Atbildīgā persona par DNL slēgšanu: Girts Miļelsons, A. Kļiņa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Darbā stāšanās datums: Norādiet vai pārējie stāšanās datumu vai darbnespējas turpināšanas datumu

Artnespējas turpināšanas datums: Norādiet vai pārējie stāšanās datumu vai darbnespējas turpināšanas datumu

ie par aizvietošanu

Paziņojuma par aizvietošanu: Darbnespējas lapa ir izdota otrā veidā. Norādiet paziņojuma par aizvietošanu

gnozes

Diagnozes veids: Pamata

Diagnoze: Citas nervu sistēmas slimības



| S | Apraksts |
|-------------|---|
| nozes veids | Diagnozes veids, izvēle no klasifikatora „Diagnozes” (1.3.6.1.4.1.38760.2.161). Pamata diagnozi var izvēlēties tikai vienu reizi. |
| noze | Diagnoze no SSK-10 klasifikatora. Papildus diagnozēm tikai izvēle no klasifikatora, bez iespējas izvēlēties „Pamata”. Papildus: 1. A lapas gadījumā pēdējā gada laikā pacientam konstatētās diagnozes ārstniecības epizodēs, attēlojot pilnu SSK-10 koku 2. B lapas gadījumā atbilstoši saistītās A lapas diagnoze SSK-10 klasifikatora formā. |
| | Pie DNL slēgšanas DNL dati tiek saglabāti. |

2. Diagnozes pievienošanas vizuālais risinājums

diagnozes pievienošanas risinājums šobrīd realizēts vairākās vietās portālā, piem. receptēs un nosūtījumos. Risinājumi veidoti atšķirīgi, dažādu moduļu ietvaros, taču darbnespējas lapām viens no šiem risinājumiem nav pieņemams, jo:

- Nosūtījumos realizēta tikai diagnožu koka apskate, bez rediģēšanas,
- Savukārt, receptšu funkcionalitātē ir:
 - 1) pilnais SSK-10 koks, kurā nevarēs realizēt vēlmi attēlot pēdējā gada diagnozes,
 - 2) un īsais saraksts, kuru ārsts veido manuāli, kas DNL funkcionalitātei nederēs.

Ar pilnu SSK-10 diagnožu koku ar papildus pop-up logu, kurā ir meklēšanas un izvēles spējas. Realizācija ir lietotājam draudzīga, ko vēlāk var izmantot arī citām formām. Šajā veidījumā lauks „Diagnoze” ir tukšs, nospiežot pogu „Pievienot” atveras pilnais SSK-10 koks, kurā iespējams pēdējā gada (no EVK) vai pilns diagnožu saraksts. Laukā „Diagnoze” izvēlētajai diagnozei tiek aizpildīta ar vērtību no pop-up loga:

The image shows two screenshots of a medical software interface. The top screenshot displays a form titled "Diagnoze" with two rows of input fields. The first row has "Diagnozes veids" with a dropdown menu set to "Pamata", and "Diagnoze" with a dropdown menu set to "Akūta limfoleikozē". The second row has "Diagnoze" with a dropdown menu set to "Papildus", and "Diagnoze" with a dropdown menu set to "Alerģija uz xx medikamentu". There are "Pievienot" buttons next to each "Diagnoze" field and a "Dzēst" button next to the second "Pievienot" button. The bottom screenshot shows a search dialog titled "Diagnoze" with a search bar containing "meklēt...". Below the search bar are three radio buttons: "pēdējā gada laikā" (selected), "visas diagnozes", and a third option. Below the radio buttons is a tree view showing a folder structure: "Akūta leikozē" (expanded), "limfoleikozē" (expanded), "ar komplikācijām", "Alerģija" (expanded), "medikamenti" (expanded), and "citi". An arrow points from the "Pievienot" button in the top screenshot to the search dialog in the bottom screenshot.

maiņas esošajā vai papildus SPKC atskaites nav šajā izmaiņu pieprasījumā iekļautas, jo šobrīd nav zināmas pasūtītāja prasības, kā arī LTC neuztur NVD Datu noliktavas sistēmu.

epieciešamās izmaiņas

darbnespējas lapas slēgšanas ekrāna formā un ar to saistītajās funkcijās paredzēta darbnespējas lapas slēgšana un apskates formā pievienoti papildus lauki pamata un papildus diagnožu (neierobežots skaits) norādīšanai.

aizstātie procesi

P_ABM_05 darbnespējas lapas sagatavošana

Ar paredzētajām izmaiņām saistīts process BP AMB 05. Procesā pagaidām izmaiņas nav

arbietilpība

- Izmaiņas nepieciešamas šādos sistēmas dokumentos:
 - NVD.VVIS.PPS.PNIS.DNL
 - NVD.VVIS.PPS.PORTALS.DNL
 - NVD.VVIS.PPA.PNIS.DNL
 - NVD.VVIS.PPA.PORTALS.DNL
 - NVD.EBOOK.PTT.5.0_Prasibu_Trasejamiba
 - NVD.EBOOK.SIS._SystemInterfaceSpecificationGuide
- Attiecīgas izmaiņas web servisos un datubāzē:
 - CloseDnl – PNIS.DNL.WS.06
 - GetDnlById – PNIS.DNL.WS.02
 - Pievienot diagnožu laukus ar papildus atvieglojumiem diagnožu aizpildīšanai vizuālais risinājums
- Testēšanas darbi:
 - Pievienot regresijas testiem jauno funkcionalitāti, ieskaitot testa datus,
 - Atjaunot testēšanas dokumentāciju (testu specifikāciju, testēšanas atskaiti)


| Uzdevuma nosaukums | c/d |
|--------------------|-------------|
| Projekta vadītājs | 3.25 |
| Sistēmu analītiķis | 12 |
| Programmētājs | 13 |
| Testētājs | 3.5 |
| Dokumentētājs | 1.75 |
| KOPĀ | 33.5 |

Personu aprēķins

Atbilstoši piedāvājuma cilvēkdienas izmaksām – 33.5 cilvēkdienas * 296 EUR = **9916 EUR**


Pasūtītājs

Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālr.: 67043700, fakss:
57043701
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Valsts kase, TREL22


A. Doveiks
Nacionālā veselības dienesta
Direktors **Doveiks**

Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
Juridiskā adrese: Dzirnāvu iela 105, Rīga, LV-
1011;
Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
Reģistrācijas Nr: 40003052786
Norēķinu konts:
LV05HABA000140X040000
AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22


J. Gulbis

Nacionālais veselības dienests
E-veselības un slāpētāviskā
sadarbības projekta ietvaros
E-veselības sistēmas izstrādes
nodrošināšanai

J. Čirule

Pasūtītāja vienošanās uzskaites
Nr.VM NVD 2014/3 ERAF-10

Izpildītāja vienošanās uzskaites
Nr. LTC-15-001465

2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās par Vienotās
veselības nozares informācijas sistēmas darbības
paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)

LĪGUMS Nr.10

par Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšanu
(iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)

Rīgā,

2015.gada 22.oktobrī

Nacionālais veselības dienests (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumiem Nr.850 „Nacionālā veselības dienesta nolikums” pārstāv direktore Daina Mūrmane - Umbraško, no vienas puses, un

SIA „Lattelecom” (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar 2015.gada 22.jūlija pilnvaru Nr.2-7/176 pārstāv pilnvarotā persona Ingus Staltmanis, no otras puses,

abi turpmāk kopā vai atsevišķi – Puse vai Puses,

slēgta konkursa “Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšana” (Nr. VM NVD 2014/3 ERAF (turpmāk – konkurss) rezultātā noslēgtās vispārīgās vienošanās (turpmāk – Vienošanās) ietvaros,

pamatojoties uz E-veselības 2.kārtas valdes, kura izveidota ar Pasūtītāja 2013.gada 9.septembra rīkojumu Nr.04.1-2/243, 2015.gada 25.septembra sēdē apstiprinātajiem sistēmas realizācijas izmaiņu pieprasījumiem IP-03 “E-receptes papildinājumi ārzemnieku identifikācijai” un IP-04 “Vakcīnas papildinājumi pie EVK-07 prasības”, kā arī Izpildītāja 2015.gada 2.oktobra vēstuli Nr.LTC-K-15-12002 „Apliecinājums”,

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas līdz 2015.gada 28. novembrim veikt sistēmas uzlabojuma realizāciju, saskaņā ar šī Līguma pielikumiem, kā arī atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Vienošanās noteikumiem (turpmāk – Pakalpojums).
- 1.2. Izpildītājs nodrošina izpildītā Pakalpojuma garantijas apkalpošanu Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas garantijas apkalpošanas ietvaros saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem.

2. Līguma apmaksas kārtība un summa

- 2.1. Pakalpojuma pieņemšana un maksājumi tiek veikti saskaņā ar kārtību, kas noteikta ar Vienošanos, pēc Pakalpojuma akceptēšanas, atbilstoši parakstītam pieņemšanas – nodošanas aktam un pēc rēķina saņemšanas.
- 2.2. Par Pakalpojuma nodrošināšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 24 272.00 euro (divdesmit četri tūkstoši divi simti septiņdesmit divi euro, 00 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN likme tiek piemērota atbilstoši rēķina izrakstīšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Pušu attiecību regulējums

Līguma izpildē tiek piemēroti visi Vienošanās noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā Līguma noteikumiem. Vienošanās ietvertais regulējums attiecināms uz Līgumu it kā būtu Līguma regulējums.

4. Citi noteikumi

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
- 4.2. Līguma termiņu var pagarināt un Līgumā izmaiņas veikt, ievērojot Vienošanās nosacījumus.
- 4.3. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Katrai pusei ir 1 (viens) Līguma eksemplārs. Līgumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa:

1. pielikums – Sistēmas uzlabojuma Nr.3 izpildes un tā finanšu piedāvājums.
2. pielikums – Sistēmas uzlabojuma Nr.4 izpildes un tā finanšu piedāvājums.


5. Pušu rekvizīti un paraksti


Pasūtītājs

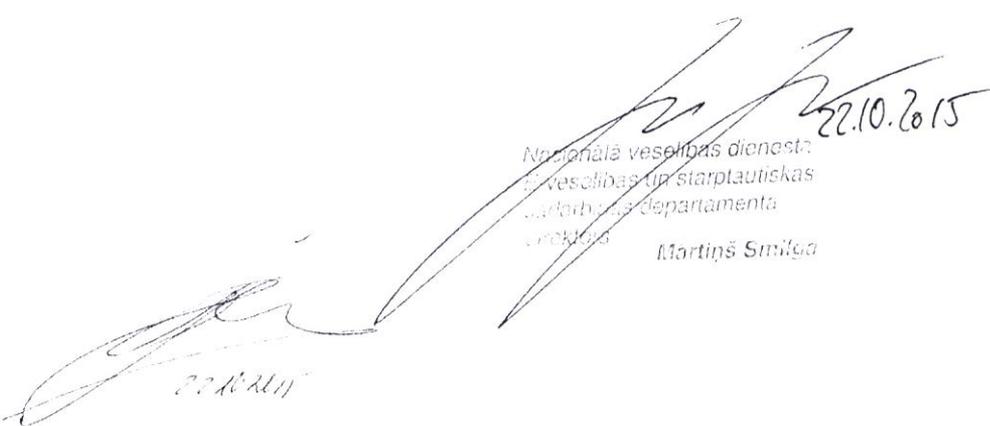
Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
Reģistrācijas Nr: 90009649337
Norēķinu konts:
LV65TREL2290674065000
Valsts kase, TREL22

Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
Juridiskā adrese: Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011;
Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
Reģistrācijas Nr: 40003052786
Norēķinu konts:
LV05HABA000140X040000
AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22


D.Mūrmane-Umbraško


I.Staffmanis


22.10.2015
Nacionālais veselības dienests
Nacionālās veselības un starptautiskās
sadarbības departaments
Direktors
Mārtiņš Smiļga

2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās par
 Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas
 darbības paplašināšanu
 (iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)
 2015.gada __.oktobra Līgumam Nr.10

Sistēmas uzlabojumu Nr.3 izpildes un tā finanšu piedāvājums

| | |
|---|--|
| Veids | Izmaiņu pieprasījums |
| Nosaukums | Izvērtējums par ārzemnieku identifikācijas tehnisko pielāgojumu atbilstoši EVK jaunajam risinājumam |
| Apgabals | EREC |
| Autors | Jevgenijs Džeriņš, Varis Auziņš |
| Sistēmu analītiķis | Jevgenijs Džeriņš, Varis Auziņš |
| Izmaiņas sistēmas arhitektūrā | Nē |
| Izmaiņas ietekmē datu apmaiņu ar ārējām sistēmām | Nav identificētas |
| Izmaiņas ietekmē citu apgabalu funkcionalitāti | Jā |
| Pieņēmumi, balstoties uz prasībām un analīzi | Ārzemnieki tiek unikāli identificēti vienas valsts ietvaros. Katram unikālam ārzemniekam ir izveidota EVK kartiņa. |

Izmaiņas pamatojums

1. Pamatojums izmaiņas atsevišķai pasūtīšanai:

Analizējot prasības POR-07, kura apraksta ārzemnieku funkcionalitāti, kritērijus no realizācijas piedāvājuma, t.i., "Portālā var ievadīt, apstrādāt, atlasīt un aplūkot informāciju par ārvalstu iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem un ārvalstu iedzīvotāju medicīnisko informāciju. Portālā ārvalstu iedzīvotāju var identificēt pēc dažādiem identificējošiem datiem vai to kombinācijām. EVK IS tiek uzkrāti dati par ārvalstu iedzīvotājiem. Sistēma ir pielāgota ārvalstu iedzīvotāju datu apstrādei tādā pašā apjomā kā par Latvijas iedzīvotājiem.", secinājām, ka prasība nav attiecināma uz VVIS eReceptes apakšsistēmu, kura nenodrošina iespējas ievadīt, apstrādāt, atlasīt un aplūkot informāciju ne par fiziskām personām sniegtajiem pakalpojumiem, ne arī par fizisko personu medicīnisko informāciju.

eRecepte ir VVIS apakšsistēma jeb modulis, kas nodrošina atbalstu biznesa procesu kopumam, kuri saistīti ārstniecības līdzekļa nozīmēšanu pacientam un tā saņemšanu aptiekā, kā arī nodrošina recepšu datu apstrādi, taču eReceptes apakšsistēma nenodrošina fizisku personu datu apstrādi, šo funkcionalitāti nodrošina EVK IS apakšsistēma. Līdz ar to uz eReceptes apakšsistēmu nav attiecināms kritērijs "Sistēma ir pielāgota ārvalstu iedzīvotāju datu apstrādei tādā pašā apjomā kā par Latvijas iedzīvotājiem".

2. Pamatojums darbu apjomam:

Mainot esošo eReceptes apakšsistēmas funkcionalitāti, ir jāveic izmaiņas gan eReceptes back-end sistēmās gan arī Portālā, kas aprakstītas sadaļā Darbietilpība 2. un 3.punktā.

Savukārt, lai nodrošinātu datu par kompensējamo medikamentu izsniegšanu ārvalstniekiem apstrādi tādā pat apjomā, kā pašreiz tiek nodrošināta datu apstrāde par kompensējamo medikamentu izsniegšanu fiziskām personām – Latvijas rezidentiem ar LV personas kodu, jāveic izmaiņas PNIS PAY moduļa servisā CreatePreparedImbursement un saistītajā funkcionalitātē, tai skaitā, izmaiņas PNIS iekšējās datu struktūrās – datubāzes ER modelī un objektorientētā koda klasēs, kā arī to kartēšanā (mapping).

Biznesa prasību apraksts

| Izmaiņa | Izmaiņas apraksts |
|---|--|
| Pielāgot ārzemnieku identifikācijas atbilstoši jaunajam risinājumam | <p>Šobrīd e-receptes IS ārzemnieku gadījumā ļauj veikt pamata procesus – izrakstīt recepti un izsniegt ĀL ārzemniekam, tomēr ārzemnieks netiek unikāli identificēts vienas valsts ietvaros, kā tas ir atbilstoši jaunajam risinājumam.</p> <p>Identificēt ārzemniekus unikāli vienas valsts ietvaros un pielāgot ar to saistītos procesus (tai skaitā receptes izrakstīšanas un ĀL izsniegšanas procesos, izmantojot EVK kartiņu pamata validāciju veikšanai):</p> <ul style="list-style-type: none">- Receptes izrakstīšana process;- ĀL izsniegšanas process;- Papīra veidlapas elektronizēšanas process;- Receptu sarakstu izgūšana;- Biežāk izrakstīto zāļu saraksta izgūšana;- Izsniegšanas ziņojumu saraksta izgūšana;- Pacientu kontaktinformācijas izgūšana. <p>Tā kā šobrīd ārzemniekiem nebūs iespējas autentificēties:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ārzemniekiem netiks nodrošināta “Manas aptiekas” izgūšana un uzstādīšana;- Apziņošanas funkcionalitāte netiks mainīta, jo ārzemniekiem nebūs iespējas norādīt apziņošanas kanālus. <p>Informācija par izsniegtajiem kompensējamiem ĀL tiks nodota uz NVD VIS arī ārzemnieku gadījumā. Datu nodošana tiks veikta ar E-booking web servisa CreatePreparedImbursement palīdzību, kurš nodrošinās jauno ārzemnieku identifikāciju.</p> <p>Novērtējumā nav iekļautas izmaiņas NVD VIS sistēmā, ja tādas būs nepieciešamas.</p> |

Darbietilpība

1. Analīze, dokumentācijas labošana. Šādu dokumentu izmaiņas:
 - a. NVD.VVIS.REC.PAK.PPS
 - b. NVD.VVIS.REC.PAK.SIS
 - c. NVD.VVIS.REC.PAK.PPA
 - d. NVD.VVIS.REC.ATS
 - e. NVD.VVIS.REC.PTT
 - f. NVD.VVIS.REC.TKP
 - g. NVD.VVIS.REC.PAK.PVA

2. Back-end izstrādei jāveic šādu web servisu izmaiņas:
 - a. RegisterMedicationOrder
 - b. GetMedicationOrderList
 - c. GetMedicineList
 - d. GetDiagnosisList
 - e. RegisterMedicationDispense
 - f. ValidateMedicationDispense
 - g. GetMedicationDispenseList
 - h. ImportMedicationOrder
 - i. CreatePreparedImbursement
3. Portālā jāveic sekojošu ekrānformu un saistītās funkcionalitātes izmaiņas:
 - a. PORTALS.EREC_UI02 "Pacienta iespējami lietojamie ĀL"
 - b. PORTALS.EREC_UI04 "Parastās/īpašās receptes izrakstīšana"
 - c. PORTALS.EREC_UI04_1 "Pacienta informācijas ievads"
 - d. PORTALS.EREC_UI08_1 "Pacienta informācijas ievads"
 - e. PORTALS.EREC_UI08_7 "ĀL izsniegšanas ziņojuma pievienošana"
 - f. PORTALS.EREC_UI12 "Pacienta receptes (ĀP)"
 - g. PORTALS.EREC_UI15 "Recepšu saraksts"
4. Testēšanas darbi:
 - a. Pievienot automātiskajiem testiem jauno funkcionalitāti, ieskaitot testa datus
 - b. Atjaunot testēšanas dokumentāciju (novērtējums iekļauts 1.punktā)


| Loma | Cilvēkdienas |
|---------------------|--------------|
| Projekta vadītājs | 5,5 |
| Vadošais analītiķis | 2,5 |
| Sistēmu analītiķis | 18,5 |
| Programmētājs | 21 |
| Testētājs | 13,5 |
| Dokumentētājs | 1 |
| KOPĀ | 62 |

Finanšu aprēķins

Atbilstoši piedāvājuma cilvēkdienas izmaksām – 62 cilvēkdienas * 296 EUR = **18'352 EUR**


Pasūtītājs


Nacionālais veselības dienests
 Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
 Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
 Reģistrācijas Nr: 90009649337
 Norēķinu konts:
 LV65TREL2290674065000
 Valsts kase, TREL22


 D.Mūrmane-Umbraško

Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
 Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011;
 Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
 Reģistrācijas Nr: 40003052786
 Norēķinu konts:
 LV05HABA000140X040000
 AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22


 I.Stallmanis


 22.10.2015
 Nacionālais veselības dienests
 E-veselības un starptautiskas
 sadarbības departaments
 direktors

Martinš Smiļģis

2014.gada 28.novembra vispārīgās vienošanās par
 Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas
 darbības paplašināšanu
 (iepirkuma identifikācijas Nr. VM NVD 2014/3 ERAF)
 2015.gada __.oktobra Līgumam Nr.10

Sistēmas uzlabojumu Nr.4 izpildes un tā finanšu piedāvājums

| | |
|---|---|
| Veids | Izmaiņu pieprasījums |
| Nosaukums | Vakcinācijas moduļa uzlabojumi, nodrošinot ārstniecības personai iespēju veikt vakcīnas norakstīšanu E-veselības portāla darba vietā |
| Apgabals | EVK |
| Autors | Juris Bērziņš |
| Sistēmu analītiķis | Juris Bērziņš |
| Izmaiņas sistēmas arhitektūrā | Nē |
| Izmaiņas ietekmē datu apmaiņu ar ārējām sistēmām | Nav identificētas. |
| Izmaiņas ietekmē citu apgabalu funkcionalitāti | Jā |
| Pieņēmumi, balstoties uz prasībām un analīzi | Back-end nodrošinās izmaiņu pieprasījuma realizēšanai nepieciešamos servīsus / izmaiņas tajos. Šī izmaiņu pieprasījuma ietvaros jāveic tikai izmaiņas Portālā. |

Biznesa prasību apraksts

| Izmaiņa | Izmaiņas apraksts |
|---------|-------------------|
| N/A | |

Izmaiņas e-veselības sistēmā

| Izmaiņa | Izmaiņas apraksts |
|--|--|
| Ekrānforma "Vakcīnas ar beigušos derīguma termiņu" | Atverot formu, automātiski jāpasauc Vakcināciju moduļa back-end servīsus GetExpiredVaccineBalance (http://ivis.eps.gov.lv/RC/HL7V3/2011/lvext/POIZ_IN200069UV_01_LV01.xsd) (kā parametru jāpadod Ārstniecības iestāde) Rezultātā tiek saņemts saraksts ar iestādes pārraudzībā esošajām vakcīnām (vakcīna, sērija, derīguma termiņš, daudzums u.c) (http://ivis.eps.gov.lv/RC/HL7V3/2011/lvext/POIZ_IN200070UV_01_LV01.xsd), kam beidzies derīguma termiņš Lietotājam jāvar izvēlēties ierakstu no saraksta un pasaukt esošo |

| | |
|---------|---|
| Izmaiņa | Izmaiņas apraksts |
| | norakstīšanas formu, tai attiecīgi padodot vakcīnu, sēriju un daudzumu. |

Prasību precizējums un piedāvātais risinājums

Ekrānforma "Vakcīnas ar beigušos derīguma termiņu"

1. Risinājums

| Vakcīnas ar beigušos derīguma termiņu | | | | |
|---------------------------------------|---------|------------------|----------|------------------|
| Vakcīna | Sērija | Derīguma termiņš | Atlikums | Darbības |
| Td | X1E3472 | 31.12.2011 | 3 | <u>Norakstīt</u> |
| Td | X1E3473 | 31.12.2011 | 3 | <u>Norakstīt</u> |
| TBE | E25678 | 31.08.2012 | 3 | <u>Norakstīt</u> |

| | | |
|--------------------------------------|--|-------------|
| Nosaukums | Vakcīnas ar beigušos derīguma termiņu | |
| Lietotājs | Ārsts, Ārstniecības iestāde | |
| Apraksts | Lietotāju saskarne ir paredzēta ārstniecības iestādes lietošanā esošo vakcīnu ar beigušos derīguma termiņu attēlošanai. | |
| Ievada parametri | VR pakalpes GetExpiredVaccineBalance izejas parametri [67]. | |
| Režimi | Lietotāju saskarne ir pieejama datu skatīšanas režīmā. | |
| Formas lauki | - | |
| Validācijas | - | |
| Formas elementu funkcijas | | |
| Saskarnes elements / notikums | Funkcionalitāte | Kad? |
| <Norakstīt> | Atver formu VR_UI26 (skat. Error! Reference source not found. nodaļu nodaļu), kurā lauki „Vakcīna”, „Vakcīnas sērija” un „Daudzums” tiek automātiski aizpildīti | Vienmēr |

| |
|---|
| Navigācija |
| Skat. 82.attēlu |
| Izmantotās funkcijas/procedūras/WS |
| GetExpiredVaccineBalance [67]; |

Darbietilpība

5. Analīze, prasību specificēšana, projektēšana, lietojamības projektēšana, dokumentācijas papildināšana. Sekojošu dokumentu izmaiņas:
 - a. NVD.VVIS.PPS.PORTALS.EVK
 - b. NVD.VVIS.PPA.PORTALS.EVK
6. Izmaiņas portāla programmatūras kodā.
7. Testēšanas darbi:
 - a. Pievienot regresijas testiem jauno funkcionalitāti, ieskaitot testa datus
 - b. Atjaunot testēšanas dokumentāciju (testu specifikāciju, testēšanas atskaiti)
 - c. Drošības testēšana
 - d. Veiktspējas testēšana
 - e. Aktualizēt automātiskos testus
8. Nodevuma sagatavošana un piegāde.


| Loma | Cilvēkdienas |
|---------------------|--------------|
| Projekta vadītājs | 2 |
| Vadošais analītiķis | 1,6 |
| Sistēmu analītiķis | 5,2 |
| Programmētājs | 7,6 |
| Testētājs | 2,8 |
| Dokumentētājs | 0,8 |
| KOPĀ | 20 |

Finanšu aprēķins

Atbilstoši piedāvājuma cilvēkdienas izmaksām – 20 cilvēkdienas * 296 EUR = **5'920 EUR**

Pasūtītājs


Nacionālais veselības dienests
 Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012;
 Tālr.: 67043700, fakss: 67043701
 Reģistrācijas Nr: 90009649337
 Norēķinu konts:
 LV65TREL2290674065000
 Valsts kase, TREL22


 D.Mūrmane-Umbraško

Izpildītājs

SIA „Lattelecom”
 Juridiskā adrese: Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011;
 Tālr.: 67055271, fakss: 67051851
 Reģistrācijas Nr: 40003052786
 Norēķinu konts:
 LV05HABA000140X040000
 AS „Swedbank”, SWIFT: HABALV22


 J.Stalmānis


 22.10.2015
 Nacionālais veselības dienests
 P. veselības un sargātības
 Sistēmas departaments
 Direktors
 Marģis Šteins

APMAKSĀT.
28.12.
Nacionālais veselības dienests
Direktors
Androjs Doveikis

lattelecom

SIA "Lattelecom"
Reģ. nr.40003052786
PVN nr.LV40003052786
Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011
Tel. 67055000
Fax. 67055481
lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

'Swedbank' AS kods HABALV22

Norēķinu konts: LV05 HABA 0001 40X0 4000 0

AS SEB banka kods UNLALV2X

Norēķinu konts: LV83 UNLA 0002 0014 6937 5

AS DNB banka kods RIKOLV2X

Norēķinu konts: LV61 RIKO 0001 1300 0079 8

Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle kods NDEALV2X

Norēķinu konts: LV48 NDEA 0000 0800 3273 9

NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS

Cēsu iela 31 K-3

Rīga

LV-1012, Latvija

| | | | |
|-------------------|--|--|-------------------|
| Rēķins Nr. | 90120526 | Izrakstīts | 23.12.2015 |
| Klients | NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS | Reģ.Nr. | 90009649337 |
| Adrese | Cēsu iela 31 K-3 Rīga LV-1012, Latvija | PVN reģ.Nr. | LV90009649337 |
| | | Līg.Nr.:Pasūtītāja līguma Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-1 | |
| | | Izpildītāja līguma Nr. LTC-14-001927 | |

| Nosaukums | Daudzums | Vien. | Līguma summa | Summa, EUR |
|-----------|----------|-------|--------------|------------|
|-----------|----------|-------|--------------|------------|

| | | | | |
|---------------------------------|---|------|----------|----------|
| Maksājums 70% apmērā saskaņā ar | 1 | gab. | 9 768.00 | 6 837.60 |
|---------------------------------|---|------|----------|----------|

Nodošanas-Pieņemšanas aktā nr. LTT4-8/933 norādīto sistēmas uzlabojumu izstrādi.

Saskaņā ar 2014.gada 28.novembrī noslēgto vispārīgo vienošanos par
"Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu".

Pasūtītāja vispārīgās vienošanās uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF,
Izpildītāja vispārīgās vienošanās līguma uzskaites Nr. LTC-14-001737

un 2014.gada 30.decembrī noslēgto Līgumu Nr.1 par "Vienotās veselības nozares elektroniskās
informācijas sistēmas darbības paplašināšanu"

Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-1
Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-001927

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Kopā | 6 837.60 |
| Ar PVN 21% apliekamā summa | 6 837.60 |
| PVN 21% | 1 435.90 |
| Rēķina kopējā summa | 8 273.50 |
| Līgumsods | 976.80 |
| Summa apmaksai | 7 296.70 |

Septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit seši eiro un 70 centi

Uz maksājuma uzdevuma lūdzam norādīt maksājuma mērķi un rēķina numuru.
Lūdzam apmaksāt līdz 26.01.2015

Izrakstīja: Gunta Razumņika
Telefons (371) - 67051212

Ar šo izrakstījumu ir jāmaksā
E-veselības sistēmas izstrādi
E-veselības sistēmas izstrādi
Izstrādāja:
Astra Ģirule

EKK 5140

| | |
|--------------------------------|-----------|
| NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS | |
| 20. 28.12.2015 | |
| Nr. | Rēķ./4942 |

Konte Nr. LV6STREL229067406500

SIA "Lattelecom"
 Reģ. nr. 40003052786
 PVN nr. LV40003052786
 Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011
 Tel. 67055000
 Fax. 67055481
lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

3DP/3.2.2.1.1/13/PIA/CFLA/008

"E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība"

lattelecom

Arūna
28.12.
 Nacionālais veselības dienests
 Andrejs Doveikis

NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS
 Cēsu iela 31 K-3
 Rīga
 LV-1012, Latvija

'Swedbank' AS kods HABALV22
 Norēķinu konts: LV05 HABA 0001 40X0 4000 0
 AS SEB banka kods UNLALV2X
 Norēķinu konts: LV83 UNLA 0002 0014 6937 5
 AS DNB banka kods RIKOLV2X
 Norēķinu konts: LV61 RIKO 0001 1300 0079 8
 Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle kods NDEALV2X
 Norēķinu konts: LV48 NDEA 0000 0800 3273 9

| | |
|---|--|
| Rēķins Nr. 90120539 | Izrakstīts 23.12.2015 |
| Klients NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS | Reģ.Nr. 90009649337 |
| Adrese Cēsu iela 31 K-3 | PVN reģ.Nr. LV90009649337 |
| Rīga | Līg.Nr.: Pasūtītāja līguma Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-10 |
| LV-1012, Latvija | Izpildītāja līguma Nr. LTC-15-001465 |

| Nosaukums | Daudzums | Vien. | Līguma summa | Summa, EUR |
|--|----------|-------|--------------|------------|
| Maksājums 70% apmērā saskaņā ar Nodošanas-Pieņemšanas aktā nr. LTT4-8/942 norādīto sistēmas uzlabojumu izstrādi. | 1 | gab. | 24 272.00 | 16 990.40 |

Saskaņā ar 2014. gada 28. novembrī noslēgto vispārīgo vienošanos par
 "Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu".
 Pasūtītāja vispārīgās vienošanās uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF,
 Izpildītāja vispārīgās vienošanās līguma uzskaites Nr. LTC-14-001737
 Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-10
 Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-001465

ERR 5140
542322 53411 344110
1141 33111 1652904
1141 542322 344110
47

| | |
|----------------------------|------------------|
| Kopā | 16 990.40 |
| Ar PVN 21% apliekamā summa | 16 990.40 |
| PVN 21% | 3 567.98 |
| Rēķina kopējā summa | 20 558.38 |
| Līgumsods | 558.21 |
| Summa apmaksai | 20 000.17 |

Divdesmit tūkstoši eiro un 12 centi

Uz maksājuma uzdevuma lūdzam norādīt maksājuma mērķi un rēķina numuru.
 Lūdzam apmaksāt līdz: 26.01.2016

Izrakstīja: Gunta Razumņika
 Telefons (371) - 67051212

L. Freimane

ERR 5140
 Nacionālais veselības dienests
 20. 28. 12. 2015
 Nr. *REK/4956*

Konta Nr. LV65 TREL 2290644065000

SIA "Lattelecom"
Reģ. nr. 40003052786
PVN nr. LV40003052786
Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011
Tel. 67055000
Fax. 67055481
lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv



NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS

Cēsu iela 31 K-3

Rīga

LV-1012, Latvija

'Swedbank' AS kods HABALV22
Norēķinu konts: LV05 HABA 0001 40X0 4000 0
AS SEB banka kods UNLALV2X
Norēķinu konts: LV83 UNLA 0002 0014 6937 5
AS DNB banka kods RIKOLV2X
Norēķinu konts: LV61 RIKO 0001 1300 0079 8
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle kods NDEALV2X
Norēķinu konts: LV48 NDEA 0000 0800 3273 9

| | | | |
|------------|--|------------------------|--|
| Rēķins Nr. | 90120527 | Izrakstīts | 23.12.2015 |
| Klients | NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS | Reģ.Nr. | 90009649337 |
| Adrese | Cēsu iela 31 K-3 Rīga LV-1012, Latvija | PVN reģ.Nr. | LV90009649337 |
| | | Līg.Nr.: | Pasūtītāja līguma Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-2 |
| | | Izpildītāja līguma Nr. | LTC-14-001928 |

| Nosaukums | Daudzums | Vien. | Līguma summa | Summa, EUR |
|---|----------|-------|--------------|------------|
| Maksājums 70% apmērā saskaņā ar Nodošanas-Pieņemšanas aktā nr. LTT4-8/934 norādīto sistēmas uzlabojumu izstrādi. | 1 | gab. | 37 888.00 | 26 521.60 |

Saskaņā ar 2014.gada 28.novembrī noslēgto vispārīgo vienošanos par
'Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu'.
Pasūtītāja vispārīgās vienošanās uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF,
Izpildītāja vispārīgās vienošanās līguma uzskaites Nr. LTC-14-001737
Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-2
Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-001928

EKK 5140
1141 53111 23156,15
514311 53111 2362,85
1141 57232 2862,85

| | |
|----------------------------|-----------|
| Kopā | 26 521.60 |
| Ar PVN 21% apliekamā summa | 26 521.60 |
| PVN 21% | 5 569.54 |
| Rēķina kopējā summa | 32 091.14 |
| Līgumsods | 3 788.80 |
| Summa apmaksai | 28 302.34 |

Divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti divi eiro un 34 centi

Uz maksājuma uzdevuma lūdzam norādīt maksājuma mērķi un rēķina numuru.
Lūdzam apmaksāt līdz 26.01.2016

Izrakstīja: Gunta Razumņika
Telefons (371) - 67051212

2015.12.23 53111 233,91 kas kopā
2015.12.23 514311 2349,49
514311 53111 2912

EKK 2259 283.02 EUR
EKK 5140 28019.31 EUR

| | |
|-----------------------------|--|
| LATVĪJAS VESELĪBAS DIENESTS | |
| Nodošanas-veelības dienests | |
| 28.12.2015 | |
| REĶ. / 4548 | |

Konta Nr. LV65TREL2290674065000

Andrejs Dovelks
Nacionālā veselības dienesta
Direktora p.i.

lattelecom

SIA "Lattelecom"
Reģ. nr.40003052786
PVN nr.LV40003052786
Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011
Tel. 67055000
Fax. 67055481
lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS
Cēsu iela 31 K-3
Rīga
LV-1012, Latvija

'Swedbank' AS kods HABALV22
Norēķinu konts: LV05 HABA 0001 40X0 4000 0
AS SEB banka kods UNLALV2X
Norēķinu konts: LV83 UNLA 0002 0014 6937 5
AS DNB banka kods RIKOLV2X
Norēķinu konts: LV61 RIKO 0001 1300 0079 8
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle kods NDEALV2X
Norēķinu konts: LV48 NDEA 0000 0800 3273 9

| | |
|---|--|
| Rēķins Nr. 90120538 | Izrakstīts 23.12.2015 |
| Klients NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS | Reģ.Nr. 90009649337 |
| Adrese Cēsu iela 31 K-3 | PVN reģ.Nr. LV90009649337 |
| Rīga | Līg.Nr.:Pasūtītāja līguma Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-9 |
| LV-1012, Latvija | Izpildītāja līguma Nr.LTC-15-001122 |

| Nosaukums | Daudzums | Vien. | Līguma summa | Summa,EUR |
|-----------|----------|-------|--------------|-----------|
|-----------|----------|-------|--------------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------------|---|------|------------|------------|
| Maksājums 70% apmērā saskaņā ar | 1 | gab. | 385 787.20 | 270 051.04 |
|---------------------------------|---|------|------------|------------|

Nodošanas-Pieņemšanas aktā nr. **LTT4-8/941** norādīto sistēmas uzlabojumu izstrādi.

Saskaņā ar 2014.gada 28.novembrī noslēgto vispārīgo vienošanos par

"Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu".

Pasūtītāja vispārīgās vienošanās uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF,

Izpildītāja vispārīgās vienošanās līguma uzskaites Nr. LTC-14-001737

Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-9

Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-001122

EKK 5740
1161 57022 57619,04
1161 53111 2600,9065
57022 53111 57619,04

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Kopā | 270 051.04 |
| Ar PVN 21% apliekamā summa | 270 051.04 |
| PVN 21% | 56 710.72 |
| Rēķina kopējā summa | 326 761.76 |
| Līgumsods | 8 873.17 |
| Summa apmaksai | 317 888.59 |

Trīs simti septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi eiro un 65 centi

Uz maksājuma uzdevuma lūdzam norādīt maksājuma mērķi un rēķina numuru.

Lūdzam apmaksāt līdz: 26.01.2016

Izrakstīja: Gunta Razumņika
Telefons (371) - 67051212

L. Freimane

EKK 2259 3178.90 EUR
EKK 5740 314709.69 EUR

Nacionālā veselības dienesta
28.12.2015
Rēķ. 4955

Konta Nr. LV65TREL2290674065000

SIA "Lattelecom"
 Reģ. nr. 40003052786
 PVN nr. LV40003052786
 Dzīrnavu iela 105, Rīga, LV-1011
 Tel. 67055000
 Fax. 67055481
lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

lattelecom

Andrejs Dovoļs
 Andrejs Dovoļs

NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS

Cēsu iela 31 K-3
 Rīga
 LV-1012, Latvija

Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle kods NDEALV2X
 Norēķinu konts: LV48 NDEA 0000 0800 3273 9

'Swedbank' AS kods HABALV22
 Norēķinu konts: LV05 HABA 0001 40X0 4000 0
 AS SEB banka kods UNLALV2X
 Norēķinu konts: LV83 UNLA 0002 0014 6937 5
 AS DNB banka kods RIKOLV2X
 Norēķinu konts: LV61 RIKO 0001 1300 0079 8

| | |
|--|--|
| Rēķins Nr. 90120528 | Izrakstīts 23.12.2015 |
| Klients NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS | Reģ.Nr. 90009649337 |
| Adrese Cēsu iela 31 K-3 Rīga LV-1012, Latvija | PVN reģ.Nr. LV90009649337 |
| | Līg.Nr.: Pasūtītāja līguma Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-3 |
| | Izpildītāja līguma Nr. LTC-15-000143 |

| Nosaukums | Daudzums | Vien. | Līguma summa | Summa, EUR |
|--|----------|-------|--------------|------------|
| Maksājums 70% apmērā saskaņā ar Nodošanas-Pieņemšanas aktā nr. LTT4-8/935 norādīto sistēmas uzlabojumu izstrādi. | 1 | gab. | 198 650.16 | 139 055.11 |

Saskaņā ar 2014.gada 28.novembrī noslēgto vispārīgo vienošanos par

"Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu".

Pasūtītāja vispārīgās vienošanās uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF,

Izpildītāja vispārīgās vienošanās līguma uzskaites Nr. LTC-14-001737

Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-3

Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-000143

ERR 5140
 1141 3311 137664,55
 1141 34222 2909,56
 342311 3311 2909,56

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Kopā | 139 055.11 |
| Ar PVN 21% apliekamā summa | 139 055.11 |
| PVN 21% | 29 201.57 |
| Summa apmaksai | 168 256.68 |

Viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit seši eiro un 68centi

Uz maksājuma uzdevuma lūdzam norādīt maksājuma mērķi un rēķina numuru.

Lūdzam apmaksāt līdz 26.01.2016

Izrakstīja: Gunta Razumņika
 Telefons (371) - 67051212

L. Freimone

Maksājuma saņēmēja nosaukums
 Pasūtītāja nosaukums
 Pasūtītāja adrese
 Pasūtītāja tālrunis
 Pasūtītāja e-pasts
 Valsts reģistrācijas Nr.
 Astra Grupe

ERR 2259 1682.57 EUR

ERR 5140 166574.81 EUR

(L. FREIMONE) izrakstīja: G.R.
 Konta Nr. LV65TREL2290674065000

SAŅEMTS
 Nacionālais veselības dienests
 2014. gada 28. 12. 2015
 Reģ. / 4949

SIA "Lattelecom"
 Reģ. nr.40003052786
 PVN nr.LV40003052786
 Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011
 Tel. 67055000
 Fax. 67055481
 lattelecom@lattelecom.lv
 www.lattelecom.lv

lattelecom

NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS
 Cēsu iela 31 K-3
 Rīga
 LV-1012, Latvija

"Swedbank" AS kods HABALV22
 Norēķinu konts: LV05 HABA 0001 40X0 4000 0
 AS SEB banka kods UNLALV2X
 Norēķinu konts: LV83 UNLA 0002 0014 6937 5
 AS DNB banka kods RIKOLV2X
 Norēķinu konts: LV61 RIKO 0001 1300 0079 8
 Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle kods NDEALV2X
 Norēķinu konts: LV48 NDEA 0000 0800 3273 9

| | |
|---|---|
| Rēķins Nr. 90120532 | Izrakstīts 23.12.2015 |
| Klients NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS | Reģ.Nr. 90009649337 |
| Adrese Cēsu iela 31 K-3 Rīga LV-1012, Latvija | PVN reģ.Nr. LV90009649337 Ltg.Nr.:Pasūtītāja līguma Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-5 Izpildītāja līguma Nr. LTC-15-000344 |

| Nosaukums | Daudzums | Vien. | Līguma summa | Summa,EUR |
|--|----------|-------|--------------|-----------|
| Maksājums 70% apmērā saskaņā ar Nodošanas-Pieņemšanas aktā nr. LTT4-8/937 norādīto sistēmas uzlabojumu izstrādi. | 1 | gab. | 114 305.12 | 80 013.58 |

Saskaņā ar 2014.gada 28.novembrī noslēgto vispārīgo vienošanos par
 "Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu".
 Pasūtītāja vispārīgās vienošanās uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF,
 Izpildītāja vispārīgās vienošanās līguma uzskaites Nr. LTC-14-001737
 Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-5
 Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-000344

TRU 5140

372311 5311 469,86
 1141 5311 698,12
 1141 572322 469,86

| | |
|----------------------------|------------------|
| Kopā | 80 013.58 |
| Ar PVN 21% apliekamā summa | 80 013.58 |
| PVN 21% | 16 802.85 |
| Rēķina kopējā summa | 96 816.43 |
| Līgumsods | 11 430.51 |
| Summa apmaksai | 85 385.92 |

Astoņdesmit pieci tūkstoši trīs simts astoņdesmit pieci eiro un 92 centi

Uz maksājuma uzdevuma lūdzam norādīt maksājuma mērķi un rēķina numuru.
 Lūdzam apmaksāt līdz 26.01.2016

EKK 2259

702259 5311 705,66
 702259 572322 468,19
 572311 5311 468,19


L. Freidmane

Izrakstīja: Gunta Razumņika
 Telefons (371) - 67051212

EKK 2259
 EKK 5140

853.85 EUR
 84532.07 EUR

Lattelecom SIA
 Elektroniskās informācijas sistēmas
 attīstība
 Cēsu iela 31 K-3
 Rīga, LV-1012
 Andrejs Davoiks



Konta Nr. LV65TREL2290644065000

Apmaksāt
Andrejs Doveikis
 Nacionālais veselības dienests
 Cēsu iela 31 K-3, Rīga, LV-1012

lattelecom

SIA "Lattelecom"
 Reģ. nr. 40003052786
 PVN nr. LV40003052786
 Dzirnau iela 105, Rīga, LV-1011
 Tel. 67055000
 Fax. 67055481
lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

Ekk 5140

4141 5311 43043,03
522211 5311 30321,69
4141 510372 90321,63

'Swedbank' AS kods HABALV22

Norēķinu konts: LV05 HABA 0001 40X0 4000 0

AS SEB banka kods UNLALV2X

Norēķinu konts: LV83 UNLA 0002 0014 6937 5

AS DNB banka kods RIKOLV2X

Norēķinu konts: LV61 RIKO 0001 1300 0079 8

Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle kods NDEALV2X

Norēķinu konts: LV48 NDEA 0000 0800 3273 9

NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS

Cēsu iela 31 K-3

Rīga

LV-1012, Latvija

| | | | |
|-------------------|--|---|----------------------|
| Rēķins Nr. | 90120542 | Izrakstīts | 23.12.2015 |
| Klients | NACIONĀLAIS VESELĪBAS DIENESTS | Reģ.Nr. | 90009649337 |
| Adrese | Cēsu iela 31 K-3 Rīga LV-1012, Latvija | PVN reģ. | LV90009649337 |
| | | Vispārīgā vienošanās Nr. VM NVD 2014/3 ERAF | |
| | | Vispārīgās vienošanās Nr. LTC-14-001737 | |

| Nosaukums | Daudzums | Vien. | Līguma summa | Summa, EUR |
|-----------|----------|-------|--------------|------------|
|-----------|----------|-------|--------------|------------|

Maksājums 30% apmērā saskaņā ar

Nodošanas-Pieņemšanas aktā nr. **LTT4-8/943** norādīto sistēmas uzlabojumu izstrādi.

Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-1 1| gab. | 9 768.00 | 2 930.40

Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-001927

Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-2 1| gab. | 37 888.00 | 11 366.40

Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-14-001928

Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-3 1| gab. | 198 650.16 | 59 595.05

Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-000143

Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-4 1| gab. | 164 628.72 | 49 388.62

Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-000144

Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-5 1| gab. | 114 305.12 | 34 291.54

Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-000344

Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-6 1| gab. | 133 250.72 | 39 975.22

Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-000345

Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-7 1| gab. | 290 438.72 | 87 131.62

Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-000402

Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-8 1| gab. | 88 825.76 | 26 647.73

Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-000536

Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-9 1| gab. | 385 787.20 | 115 736.16

Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-001122

Pasūtītāja līguma uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF-10 1| gab. | 24 272.00 | 7 281.60

Izpildītāja līguma uzskaites Nr. LTC-15-001465

Saskaņā ar 2014. gada 28. novembrī noslēgto vispārīgo vienošanos par

"Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbības paplašināšanu".

Pasūtītāja vispārīgās vienošanās uzskaites Nr. VM NVD 2014/3 ERAF,

Izpildītāja vispārīgās vienošanās līguma uzskaites Nr. LTC-14-001737

Kopā 434 344.34

Ar PVN 21% apliekamā summa 434 344.34

PVN 21% 91 212.30

Summa apmaksai 525 556.64

Pieci simti divdesmit pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit seši EUR un 64 centi

Uz maksājuma uzdevuma lūdzam norādīt maksājuma mērķi un rēķina numuru.

Lūdzam apmaksāt līdz 26.01.2015

Ekk 2259 5131,98 EUR

Ekk 5140 520424.66 EUR


Izrakstīja: Gunta Razumpika

Telefons (371) - 67051212

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]

Freimane



Konte Nr. LVGSTRCL2290674065000



Satiksmes ministrija

Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, tālr. 67028210, fakss 67217180, e-pasts satiksmes.ministrija@sam.gov.lv, www.sam.gov.lv

Rīgā 01.03.2017. Nr. 01-08/717
uz 23.02.2017. Nr. 622.12/1-69-12/17
27.02.2017. Nr. 622.12/1-77-12/17

DEPUTĀTU JAUTĀJUMS
Nr. 274 /J12

Saeimas Administrācijai

Informācijai: Ministru prezidentam

Par atbilžu sniegšanu uz Saeimas
deputātu jautājumiem

Ar Ministru prezidenta 2017.gada 24.februāra rezolūciju Nr.45/SAN-296 un 2017.gada 28.februāra rezolūciju Nr.45/SAN-296/2420 Satiksmes ministrijai uzdots sagatavot un sniegt atbildes uz Saeimas deputātu jautājumiem "Par sabiedrības "RB rail" darbības rezultātiem" (jautājuma reģistra Nr.274/J12).

Satiksmes ministrija, pamatojoties uz SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" iesniegto informāciju, saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 121.panta pirmo daļu sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

1. Iesniegt projekta "Rail Baltica" ekonomisko pamatojumu, kas izstrādāts, ņemot vērā aktualizēto informāciju par reālajām projekta izmaksām un analīzi par sagaidāmajiem ieguvumiem un zaudējumiem.

2. Iesniegt aprēķinus, kas pamato, kādas Latvijai būs šī projekta ekspluatācijas izmaksas un kā tās tiks segtas?

Atbildot uz Saeimas deputātu 1. un 2. jautājumu, saskaņā ar SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" (turpmāk – sabiedrība) sniegto informāciju, informējam, ka Rail Baltica projekta sākotnējais ekonomiskais pamatojums tika izstrādāts 2011.gadā, ko 3 Baltijas valstu uzdevumā veica AECOM. Minētā izpēte identificēja provizorisko trases novietojumu un identificēja, ka ar Eiropas Savienības atbalstu projekts ir realizējams. Kopš 2011.gada Baltijas valstis veikušas nozīmīgu darbu pie projekta realizēšanas, t.sk. noteikta precīza trases atrašanās vieta Latvijā un Lietuvā, bet Igaunijā tiks noteikta tuvākajā laikā. Jauniegūtie dati, kalpo par pamatu aktualizētai ieguvumu izdevumu analīzei, kuru ir pasūtījis AS "RB Rail". Minēto analīzi veic kompānija E&Y. Analīzes rezultātus plānots prezentēt š.g. 24./25.aprīlī Rail Baltica konferences ietvaros.

Papildus informējam, ka AS "RB Rail" šogad uzsāks darbu pie Rail Baltica Komercializācijas plāna, kā arī izpētes par Rail Baltica infrastruktūras pārvaldību, kuras mērķis ir analizēt iespējamus projekta ietvaros izbūvētās infrastruktūras pārvaldības modeļus. Balstoties uz šīs izpētes secinājumiem, līdz 2018.gada beigām sagaidāma vienošanās par infrastruktūras pārvaldības modeli.

SANĒMTS
Latvijas Republikas Saeimā

01.03.2017. plkst. :

Nr. 1/65 12/17

Sauņemts pa faksu 01.03.2017.

3. Iesniegt apstiprināto “RB rail” darbības plānu un darbībām (funkcijām) paredzēto finansējumu.

Atbildot uz 3.jautājumu, informējam, ka 2017.gadā kā primārie AS “RB Rail” darba uzdevumi ir izvirzīti kopuzņēmuma organizatoriskās struktūras ieviešanu praksē, kopuzņēmuma un projekta ilgtermiņa finansēšanas sistēmas noteikšana, projekta ietvaros īstenoto iepirkumu vienotās politikas, vadlīniju, kā arī līgumu projektu izstrāde. Papildus atzīmējams, ka kopuzņēmums projekta vajadzībām 2017.gadā plāno izsludināt un vadīt vairāk kā 30 iepirkumus, kā arī saskaņā ar 2016.gada rudenī apstiprināto Nolīgumu par līgumu slēgšanas shēmu Rail Baltica projektam piedalīties nacionālo ieviesējorganizāciju organizēto iepirkumu komisijās.

4. Vai un kā valdība pārrauga “Rail Baltica” projekta realizācijas gaitu?

SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” sadarbībā ar Satiksmes ministriju regulāri gatavo un iesniedz Ministru kabinetam informatīvos ziņojumus, informējot gan par projekta progresu, gan saņemot akceptu pieteikties EISI finansējumam.

5. Vai projekta realizācijas gaita ir apmierinoša jeb nepieciešams veikt darbības korekcijas? Ja, Jūsaprāt, ir nepieciešamas korekcijas – lūdzam informēt kādas?

Ņemot vērā ilgstošās diskusijas par projekta pārvaldības modeli, t.sk. Nolīgumu par līgumu slēgšanas shēmu Rail Baltica projektam parakstot tikai 2016.gada rudenī, globālā projekta īstenošana atsevišķās aktivitātēs nedaudz kavējas. Aktuālā situācija tiek identificēta ikgadējā Aktivitātes progresa ziņojumā par 2016.gadu, kuru plānots iesniegt Eiropas Savienības Inovācijas un tīklu izpildaģentūrai (INEA) līdz š.g. 31.martam, t.sk. nosakot skaidrus risku vadības procesus. Līdz šim Latvija veiksmīgi realizē projektu gan nosakot trasi, gan veicot metu konkursu Rīgas multimodālajam mezglam, izsludinot iepirkumu par Rail Baltica stacijas projektēšanu starptautiskajā lidostā “Rīga”, kā arī veicot nepieciešamos sagatavošanās darbus nekustamā īpašuma atsavināšanas vajadzībām.

6. Lūdzam iesniegt informāciju par “RB rail” paveikto. Ja ir veikts “RB rail” valdes darbības izvērtējums – lūdzam iesniegt arī to.

7. Ja “RB rail” valdes izvērtējums nav veikts, lūdzam informēt, kad ir plānots veikt? Pēc kādiem kritērijiem, paveiktiem uzdevumiem tiks vērtēts “RB rail” valdes darbs?

Atbildot uz 6. un 7. jautājumu, saskaņā ar Sabiedrības sniegto informāciju, informējam, ka kopuzņēmuma valde līdz šim ir strādājusi nepilnā sastāvā. Līdz šim vienīgais valdes loceklis ir valdes priekšsēdētājs. Plānots, ka līdz š.g. marta beigām tiks noslēgts pārējo valdes locekļu atlases process.

Papildus informējam, ka saskaņā ar Komerclikuma 175.pantu pie 2016.gada pārskata apstiprināšanas tiks izskatīts padomes sagatavots ziņojums, kurā tiks iekļauts sabiedrības valdes darbības izvērtējums.

Satiksmes ministrs



U.Augulis
